
착 공 계

국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

(주) 아 산

목 차

1. 착 공 신 고 서
2. 현 장 기 술 자 지 정 신 고 서
3. 현 장 조 직 도
4. 예 정 공 정 표
5. 동 원 인 원 계 획 표
6. 장 비 투 입 계 획 서
7. 착 공 전 사 진 대 지
8. 공 사 도 급 계 약 서 사 본 및 계 약 내 역 서
9. 품 질 시 험 계 획 서
10. 안 전 관 리 계 획 서
11. 환 경 관 리 계 획 서
12. 교 통 처 리 계 획 서
13. 직 접 시 공 계 획 서
14. 노 무 비 세 부 사 항 합 의 서
15. 기 타 서 류 (사 업 자 등 록 증 외)

1. 착 공 신 고 서

착 공 신 고 서

경유 : 책임건설사업관리자 한 상 태 (인)

1. 공 사 명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물 보수공사
2. 계 약 금 액 : 일금 오억칠천일백이만이천칠백원정 (₩ 571,022,700)
3. 위 치 : 경기도 남양주시 호평동 [호평IC교(상)]
경기도 가평군 청평면 대성리 [신구운교(춘천)]
경기도 가평군 가평면 외서면 청평 [조종교]
경기도 남양주시 평내동 [사능1교(상)]
경기도 남양주시 평내동 [사능1교(하)]
경기도 남양주시 진건읍 적성교
경기도 남양주시 호평동 [호평IC교(하)]
4. 계 약 년 월 일 : 2026년 03월 27일
5. 착 공 년 월 일 : 2026년 04월 01일
6. 준 공 년 월 일 : 2026년 07월 29일

상기와 같이 착공신고서를 제출합니다.

2026년 04월 01일

경 기 도 남 양 주 시 다 산 중 앙 로 146 번 길 70-123, 2 층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

2. 현 장 기 술 자 지 정 신 고 서

현장기술자 지정신고서

1. 공 사 명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

2. 기술자 현황

구분	현장대리인	안전관리자	품질관리자	비고
성 명	유병화	추후 선임 예정	이인근	
생년월일	1963.06.12		1961.02.28	
주 소	경기 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1		경기도 고양시 덕양구 오부자로 15	
자격종목 및 등급	토목 고급		품질 초급	
자격번호	92201020128R (#0004539)		23401290936B (#1003999)	

첨 부 : 1. 건설기술자 경력증명서
2. 자격증사본

의정부국토관리사무소장 귀하

현장대리인선임계

1. 성 명 : 유병화
2. 생 년 월 일 : 1963.06.12
3. 주 소 : 경기도 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1
4. 자 격 증 번 호 : 92201020128R(#0004539)
5. 종 목 및 등 급 : 토목 고급

상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 현장대리인으로
선정하고 이에 현장대리인 선임계를 제출합니다.

2026년 04월 01일

경 기 도 남 양 주 시 다 산 중 앙 로 146 번 길 70-123, 2 층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

안전보건총괄책임자 선임계

1. 성 명 : 유병화
2. 생 년 월 일 : 1963.06.12
3. 주 소 : 경기도 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1
4. 자 격 증 번 호 : 92201020128R(#0004539)
5. 종 목 및 등 급 : 토목 고급

상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 안전보건총괄책임자로
선정하고 이에 안전보건총괄책임자 선임계를 제출합니다.

2026년 04월 01일

경 기 도 남 양 주 시 다 산 중 앙 로 146 번 길 70-123, 2 층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

재 직 증 명 서

성 명	유병화	생 년 월 일	1963.06.12
주 소	경기도 남양주시 화도읍 수레로1120번길 33-1		
부 서 명	시 공 부	직 책	이 사
재 직 기 간	2021년 12월 01일 부터 현재까지		
사 용 용 도	현장대리인 선임계		

위와 같이 당사에 재직하고 있음을 증명함.

2026년 04월 01일

경 기 도 남 양 주 시 다 산 중 앙 로 146 번 길 70-123, 2 층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

2026년 04월 09일

한국건설기술인협회

(3쪽 중 제1쪽)

건설기술인 경력증명서

관리번호 # 0 0 0 4 5 3 9	발급번호 20260409 - C02434092
인적사항	성명(한글) 유명화 (한자) 생년월일 63.06.12 주소 경기 남양주시 화도읍 수레로 1120번길 33-1 105동 1202호(영남탑스빌아파트)
등급	설계·시공 등 전문분야 직무분야 전문분야 품질관리 토목 고급 토목시공 중급 토목 초급 토목시공 초급 특급 안전관리 초급 건설안전 초급 안전관리 초급 건설안전 초급
국가 기술자격	종목 및 등급 합격일 등록번호 산업안전기사 1992.03.09 92201020128R 종목 및 등급 합격일 등록번호
학력	졸업일 학교명 학과(전공) 학위 1990.02.22 강원대학교 토목공학과 학사[졸업]
교육훈련	교육기간 과정명 교육기관명 교육인정여부 2019.04.22 ~ 2019.04.26 품질관리기술인최초특급기본교육 건설기술교육원 품질관리 2019.04.15 ~ 2019.04.19 품질관리기술인최초특급전문교육 건설기술교육원 품질관리 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 3 제2호나목1)나),2)나)(1)·(2) 및 3)나)에 따른 의무교육 이수 시간 - 설계·시공 등 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육:
상훈	수여일 수여기관 종류 및 근거 ** 해당없음 **
벌점 및 제재사항	벌점 *해당없음* 제재일 종류 및 제재기간 근거 제재기관 ** 해당없음 **
근무처	근무기간 상호 근무기간 상호 1990.02.01 ~ 유신토건(주) 1991.02.10 (주)신한 2004.05.26 ~ (주)수일건설 2009.12.15 2010.02.17 ~ 대성토건(주) 2010.11.23 2011.03.02 ~ 피앤피종합건설(주) 2012.07.31 2014.12.08 ~ (주)현이앤씨 2016.08.25 現:(주)홀딩스현 2017.02.22 ~ (주)한국교량 2018.07.31 2018.08.01 ~ (주)한국엔지니어링 2021.11.30 2021.12.01 ~ (주)아산 근 무 중



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
1990.02.01 ~ 1991.02.10 (375일)	와부-상면간도로확포장공사		토목	시공	
	경기도남양주시청			사원	
1991.02.19 ~ 1994.05.01 (1,168일)	서울시지하철7-10공구건설공사		토목	시공	
	서울지하철건설본부	지하철, 터널	철도·삭도	대리	
	NATM				
1994.05.02 ~ 1995.02.05 (280일)	서해안고속도로(안산-안중간)제2공구		토목	공무	
	한국도로공사	고속도로, 터널, 교량	도로및공항	대리	
1995.02.06 ~ 1996.04.07 (427일)	서울시지하철7-10공구건설공사		토목	공무	
	서울지하철건설본부	지하철	철도·삭도	대리	
1996.04.08 ~ 1996.12.17 (254일)	수원열원-북수원연계지역난방공사		토목	시공	
	한국지역난방공사	관로	토목시공	대리	
1996.12.18 ~ 1997.10.19 (306일)	서방지하도로(상가도로)시설조성공사		토목		
	광주광역시	지하도로	도로및공항	과장	
	개착				



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
1997.10.20 ~ 1998.08.31 (316일)	경원선복복선전철제2공구노반신설공사		토목	시공	
	철도청	철도	철도·삭도	과장	
1998.09.01 ~ 1999.09.30 (395일)	경인선구로-인천간복복선전철제3공구노반공사		토목	시공	
	철도청	철도	철도·삭도	과장	
1999.10.01 ~ 2001.05.09 (587일)	신갈-안산고속도로확장공사(제3공구)		토목	시공	
	한국도로공사	고속도로, 터널, 교량	도로및공항	과장	
2004.05.26 ~ 2006.11.30 (919일)	지하철3호선연장301공구건설공사		토목	현장소장	
	철도청	지하철	토목시공	부장	
2006.12.01 ~ 2009.05.31 (913일)	마평-진부국도건설공사		토목	현장소장	
	원주지방국토관리청	터널및구조물	토목시공	부장	
2009.06.01 ~ 2009.12.15 (198일)	진주광양복선화제6공구노반건설공사/구조물공(2-1구간)		토목	현장소장	
	한국철도시설공단	철도, 교량	토목시공	부장	



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2010.02.17 ~ 2010.02.21 (5일)	청주내덕(울랑)-청원북일(북이)도로건설공사토공및터널공, 구조물공사(2공구)		토목	착공준비	
	대전지방국토관리청, 대우건설(주)	도로	토목시공	부장	
2010.02.22 ~ 2010.11.23 (275일)	청주내덕(울랑)-청원북일(북이)도로건설공사토공및터널공, 구조물공사(2공구)		토목	시공	
	대전지방국토관리청, 대우건설(주)	도로	토목시공	부장	
			*현장대리인		
2011.03.02 ~ 2011.03.27 (26일)	본사		토목	총괄	
				이사	
2011.03.28 ~ 2011.07.31 (126일)	충주연수파크빌신축공사		토목	시공	
	이광훈	단지조성		이사	
2011.08.01 ~ 2011.09.18 (49일)	본사		토목	사업관리	
				이사	
2011.09.19 ~ 2012.02.12 (147일)	공근공장신축공사		토목	시공	
	(주)기륭	단지조성		이사	



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2012.02.13 ~ 2012.04.19 (67일)	백석동벽산블루밍(아)연결도로(중로2-50호)개설공사		토목	시공	
	천안시청	도로		이사	
			*현장대리인		
2012.04.20 ~ 2012.07.31 (103일)	직산읍삼은리도시계획도로(소2-912)개설공사		토목	시공	
	천안시청	도로		이사	
			*현장대리인		
2017.03.02 ~ 2017.06.06 (97일)	광명동굴내-1편보강및정비공사중보강공사		토목	시공	
	경기도광명시, 신진종합건설(주)	토공사	토목구조	상무	
			현장대리인		
2017.06.07 ~ 2018.01.09 (217일)	광명동굴1편북측강도구간보강공사중광명동굴보강공사		토목	시공	
	경기도광명시/범양건양(주)	토공사	토목시공	상무	
			현장대리인		
2018.01.10 ~ 2018.07.31 (203일)	광명동굴0레벨(#1,2,3)및-1레벨(#2)보강공사중토공사		토목	시공	
	경기도광명시/통일건설(주)	토공사	토목시공	상무	
			현장대리인		
2018.08.01 ~ 2021.06.01 (1,036일)	본사		토목	사업관리	
				상무	



본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.koce.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2021.06.02 ~ 2021.08.31 (91일)	사자레스텔보수공사		건축	시공	
	제11기동사단	도장	건축시공	상무	
			참여기술인		
2021.09.01 ~ 2021.11.30 (91일)	21-152한울아파트노후시설개선공사		건축	시공	
	수도방위사령부	도장	건축시공	상무	
			참여기술인		
2021.12.01 ~ 2024.01.31 (792일)	남양주도농근린공원민간개발조성공사		토목	시공	
	(주)디트루	공원	토목시공	이사	
			참여기술인		
2024.02.01 ~ 2026.03.31 (790일)	본사/공무부		토목	본부공무	
				이사	
2026.04.01 ~ 2026.04.03 (3일)	국도46호선호평IC교(상)등포장및시설물보수공사		토목	품질관리	
	의정부국토관리사무소		토목품질관리	이사	
			품질관리자		
2026.04.04 ~ 근 무 중 (5일)	국도46호선호평IC교(상)등포장및시설물보수공사		토목	시공	
	의정부국토관리사무소		토목시공	이사	
			현장대리인		

※ 적용 용·복합건설기술란, 적용 신기술 등란 및 시설물 종류란은 발주청(인·허가기관)의 확인으로 신고된 사항만을 적으며, 미신고된 란은 생략 가능합니다.



본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.koce.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

2. 건설사업관리 및 감리경력

※ 「건설기술 진흥법 시행령」 제45조제1항, 제2항 및 제5항에 따라 통보되는 건설사업관리용역 및 감리용역 참여 경력만 해당합니다.

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
(일)	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
~ (일)	*** 해당 없음 ***				

※ 적용 용·복합건설기술란, 적용 신기술 등란 및 시설물 종류란은 발주청(인·허가기관)의 확인으로 신고된 사항만을 적으며, 미신고된 란은 생략 가능합니다.

○ 건설사업관리 업무 수행기간 : 0 일

- 상 주 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]
 - 기술지원 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]

○ 감리 업무 수행기간 : 0 일

- 상 주 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]
 - 기술지원 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]

○ 건설사업관리기술인으로서 안전관리 업무 수행기간 : 0 일

※ 업무 수행 중복기간은 건수로 나누어 산정하여 기록함

○ 건설사업관리 및 감리(최근 1년간) 용역 완성비율 : 0 % (참여건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건, 완료건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건)

3. 배치금지(「건설기술 진흥법 시행규칙」 제27조제2항제4호에 따라 철수한 경우만 기재)

용역명	근무형태	직책	근무기간	배치금지 기간
** 해당없음 **			~	~



분야별 참여기간 인정일 및 건설기술진흥법령 외 자격·학력 등

1. 분야별 참여기간 인정일

공사종류별 인정일수 현황	
고속도로, 교량, 터널	867 일
공원	792 일
관로	254 일
교량, 철도	198 일
단지조성	273 일
도로	450 일
도장	182 일
지하도로	306 일
지하철	1,346 일
지하철, 터널	1,168 일
철도	711 일
터널및구조물	913 일
토공사	517 일
기타(본사근무)	1,901 일
기타(미기재)	383 일
인정일수 합계	10,261 일

직무/전문분야별 인정일수 현황	
건축/건축시공	182 일
토목/토목구조	97 일
토목/도로및공항	1,173 일
토목/철도·삭도	2,306 일
토목/토목시공	3,781 일
토목/토목품질관리	3 일
토목/(미기재)	2,719 일
인정일수 합계	10,261 일

※ 기술경력의 참여기간이 중복된 경우 인정일수 산정시 소수점이하를 절삭하여 공사종류별 인정일수 합계와 직무/전문 분야별 인정일수 합계의 차이가 있을 수 있습니다.

※ 공사종류별 인정일수 현황 중 공사종류를 2종이상으로 신고한 경우, 가나다순으로 정렬 후 합산 표기하였습니다.

2. 건설기술진흥법령 외 자격·학력·교육훈련 및 상훈

자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
	** 해당없음 **					
학력	졸업일	학교명	학과(전공)		학위	
	** 해당없음 **					
교육훈련	교육기간	교육기관명	과정명			
		** 해당없음 **				
상훈	수여일	수여기관	종류 및 근거			
	** 해당없음 **					

※ 위 사항은 건설기술 진흥법령에 따른 관리대상에 해당하지 않으며, "건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준(국토교통부 고시)" 제17조제6항 후단에 따라 진위여부는 확인되지 않은 사항입니다.



본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.kocea.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

국가기술훈련원

등록번호 92201020128R

성명 유병화

기술자격종목 및 등급 1431

산업안전기사급

주민등록번호 630612-1222414

주소 경기 남양주 화도읍 차산리 712

발급일자 1992년 3월 9일

유효기간 1992년 3월 2일

한국산업인력관리공단




5. 업무정지 처분을 받은 건설기술자가 제4호에 따라 건설기술경력증을 발급하지 않은 경우 「건설기술 진흥법」 제91조제2항제4호 및 같은 법 시행령 제121조제1항 별표 11에 따라 50만원의 과태료 처분을 받게 됩니다.

건설기술경력증 (재발급)



발급번호 600662222

성명 유병화 (#0004539)

발급일 2015년 05월 28일

생년월일 1963년 06월 12일

「건설기술 진흥법」 제21조제2항에 따라 건설기술경력증을 발급합니다.

한국건설기술인협회장



원본대조필



품질관리자선임계

1. 성 명 : 이인근
2. 생 년 월 일 : 1961.02.28
3. 주 소 : 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15
4. 자 격 증 번 호 : 23401290936B(#1003999)
5. 종 목 및 등 급 : 품질 초급

상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 품질관리자로
선정하고 이에 품질관리자 선임계를 제출합니다.

2026년 04월 01일

경 기 도 남 양 주 시 다 산 중 앙 로 146 번 길 70-123, 2 층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

재 직 증 명 서

성 명	이인근	생 년 월 일	1961.02.28
주 소	경기도 고양시 덕양구 오부자로 15		
부 서 명	시 공 부	직 책	이 사
재 직 기 간	2022년 02월 07일 부터 현재까지		
사 용 용 도	품질관리자 선임계		

위와 같이 당사에 재직하고 있음을 증명함.

2026년 04월 01일

경기도 남양주시 다산중앙로 146번길 70-123, 2층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (안)



의정부국토관리사무소장 귀하

2026년 04월 08일

한국건설기술인협회장

(3쪽 중 제1쪽)

건설기술인 경력증명서

관리번호 # 1 0 0 3 9 9 9	발급번호	20260408 - C02427064			
인적사항	성명(한글) 이인근 주소 경기 고양시 덕양구 오부자로 15 102동 2802호(지축동, 지축역한림플에버)	(한자) 李仁根	생년월일	61.02.28	
등급	설계·시공 등 직무분야	전문분야	건설사업관리 직무분야	전문분야	품질관리
	토목 초급	토목시공 초급	** 생략 **	** 해당없음 **	초급
국가 기술자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일
	거꾸집기능사	2023.04.19	23401290936B		
학력	졸업일	학교명	학과(전공)	학위	
	** 해당없음 **				
교육훈련	교육기간	과정명	교육기관명	교육인정여부	
	2024.05.11 ~ 2024.08.22 2024.04.19 ~ 2024.05.10	설계시공기술인최초초급전문교육(원격교육) 설계시공기술인최초초급기본교육(원격교육)	건설기술교육원 건설기술교육원	설계·시공 설계·시공	
「건설기술 진흥법 시행령」 별표 3 제2호나목1)나),2)나)(1)·(2) 및 3)나)에 따른 의무교육 이수 시간 - 설계·시공 등 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육:					
상훈	수여일	수여기관	종류 및 근거		
	** 해당없음 **				
벌점 및 제재사항	벌점	*해당없음*		근거	제재기관
	제재일	종류 및 제재기간 ** 해당없음 **			
근무처	근무기간	상호	근무기간	상호	
	2016.03.02 ~ 2017.03.10	에스지신성건설(주)	2022.02.07 ~ 근 무 중	(주)아산	



본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.koceia.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용 · 복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2016.03.02 ~ 2017.03.10 (374일)	아산신도시배방지구오피스텔신축사업		토목	시공	
	한국자산신탁(주)		토목시공	부장	
			참여기술인		
2022.02.07 ~ 2023.07.24 (533일)	남양주 도농그린공원 민간개발 조성공사		토목	시공	
	(주)디트루		토목시공	이사	
			참여기술인		
2023.07.25 ~ 2023.07.25 (1일)	본사/관리부		토목	본부공무	
				이사	
2023.07.26 ~ 2023.08.08 (14일)	남양주 도농근린공원 민간개발 조성공사		토목	시공	
	(주)디트루		토목시공	이사	
			참여기술인		
2023.08.09 ~ 2026.03.31 (966일)	본사/업무부		토목	본부공무	
				이사	
2026.04.01 ~ 2026.04.03 (3일)	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사		토목	시공	
	의정부국토관리사무소		토목시공	이사	
			현장대리인		



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2026.04.04 ~ 근 무 중 (4일)	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사		토목	품질관리	
	의정부국토관리사무소		토목품질관리	이사	
			품질관리자		

※ 적용 용·복합건설기술란, 적용 신기술 등란 및 시설물 종류란은 발주청(인·허가기관)의 확인으로 신고된 사항만을 적으며, 미신고된 란은 생략 가능합니다.

KOCEA



본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.koce.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

2. 건설사업관리 및 감리경력

※ 「건설기술 진흥법 시행령」 제45조제1항, 제2항 및 제5항에 따라 통보되는 건설사업관리용역 및 감리용역 참여 경력만 해당합니다.

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
~ (일)	*** 해당 없음 ***				

※ 적용 용·복합건설기술란, 적용 신기술 등란 및 시설물 종류란은 발주청(인·허가기관)의 확인으로 신고된 사항만을 적으며, 미신고된 란은 생략 가능합니다.

○ 건설사업관리 업무 수행기간 : 0 일

- 상 주 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]
 - 기술지원 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]

○ 감리 업무 수행기간 : 0 일

- 상 주 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]
 - 기술지원 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]

○ 건설사업관리기술인으로서 안전관리 업무 수행기간 : 0 일

※ 업무 수행 중복기간은 건수로 나누어 산정하여 기록함

○ 건설사업관리 및 감리(최근 1년간) 용역 완성비율 : 0 % (참여건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건, 완료건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건)

3. 배치금지(「건설기술 진흥법 시행규칙」 제27조제2항제4호에 따라 철수한 경우만 기재)

용역명	근무형태	직책	근무기간	배치금지 기간
** 해당없음 **			~	~



분야별 참여기간 인정일 및 건설기술진흥법령 외 자격·학력 등

1. 분야별 참여기간 인정일

공사종류별 인정일수 현황		직무/전문분야별 인정일수 현황	
기타(본사근무)	967 일	토목/토목시공	924 일
기타(미기재)	928 일	토목/토목품질관리	4 일
인정일수 합계	1,895 일	토목/(미기재)	967 일
		인정일수 합계	1,895 일

※ 기술경력의 참여기간이 중복된 경우 인정일수 산정시 소수점이하를 절삭하여 공사종류별 인정일수 합계와 직무/전문분야별 인정일수 합계의 차이가 있을 수 있습니다.

※ 공사종류별 인정일수 현황 중 공사종류를 2종이상으로 신고한 경우, 가나다순으로 정렬 후 합산 표기하였습니다.

2. 건설기술진흥법령 외 자격·학력·교육훈련 및 상훈

자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
	** 해당없음 **					
학력	졸업일	학교명	학과(전공)		학위	
	** 해당없음 **					
교육훈련	교육기간	교육기관명	과정명			
	** 해당없음 **					
상훈	수여일	수여기관	종류 및 근거			
	** 해당없음 **					

※ 위 사항은 건설기술 진흥법령에 따른 관리대상에 해당하지 않으며, "건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준(국토교통부 고시)" 제17조제6항 후단에 따라 진위여부는 확인되지 않은 사항입니다.



22-02-069360

◀ 주의 사항 ▶

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 제시해야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 취업 중인 사업체 등에 변동이 있을 때에는 이의 청정을 요청해야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여, 차용, 일선하면 「국가기술자격법」 제26조 제3항에 따라 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 업무를 성실히 수행하지 않거나 품위를 손상시켜 공익을 해치거나 타인에게 손해를 입히거나 국가기술자격증을 다른 사람에게 빌려 주는 경우 등에는 같은 법 제16조에 따라 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소되거나 정지된 사람은 지체 없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납해야 합니다.

국가기술자격증

■ 자격번호 : 23401290936B

■ 자격종목 : 기푸집기능사

■ 성 명 : 이인근

■ 생년월일 : 1961.02.28

위 사람은 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득하였음을 증명합니다.

■ 합격 연월일 : 2023 년 04 월 19 일

■ 발급 연월일 : 2023 년 04 월 19 일

국토교통부

※ 본 국가기술자격증은 「국가기술자격법」 제23조에 따라 국토교통부장관 외 위임을 받은 한국산업인력공단 이사장이 확인 발급함.

한국산업인력공단 이사장



원본대조필




3. 현 장 조 직 도

현장조직도

현장기구조직도

국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

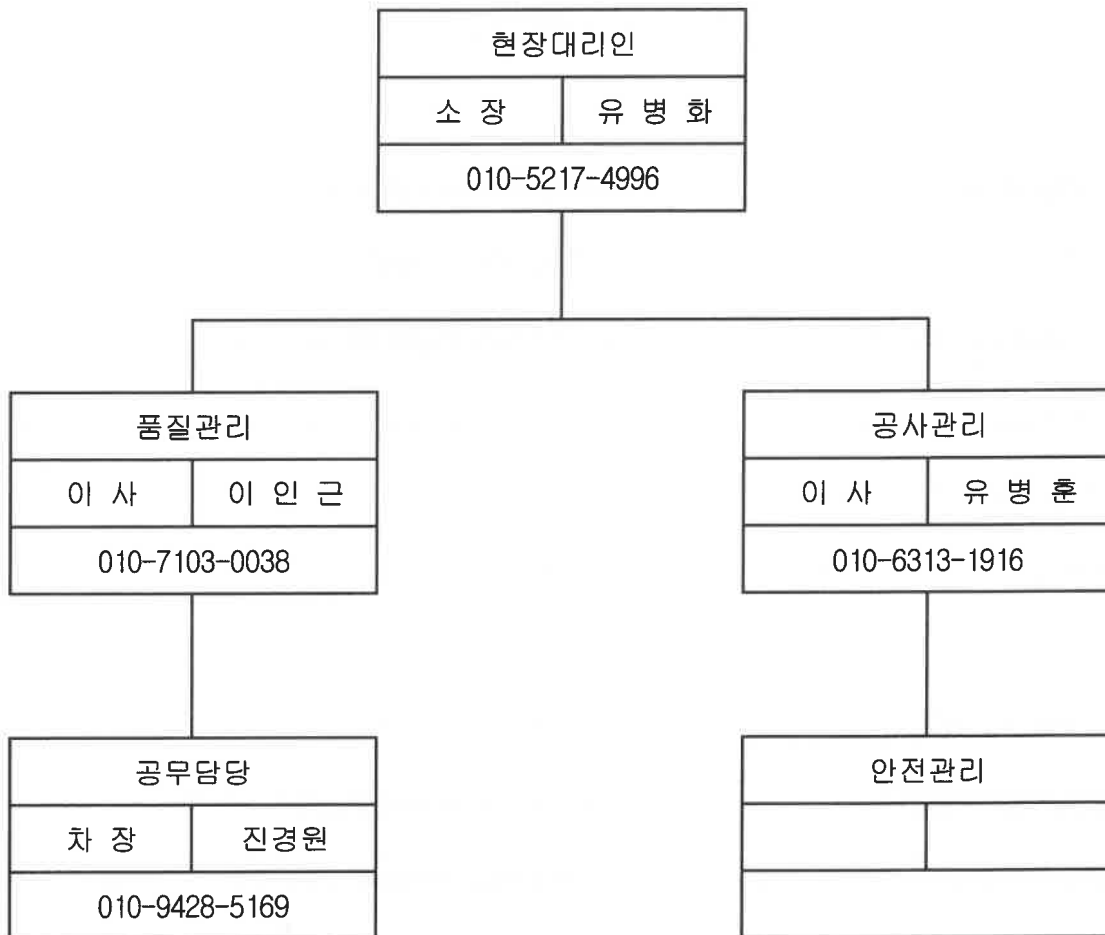

4. 예 정 공 정 표

예 정 공 정 표

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사

공 종		보 할	작수 20 일	작수 40 일	작수 60 일	작수 80 일	작수 100 일	작수 120 일	비 고
1. 국도46호선 호평IC교(상)		63.4%	자재 및 현장준비		15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	
2. 국도46호선 신구운교등		36.6%	자재 및 현장준비		9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	
소 계	소 계	100.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	
누 계	누 계		0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층

상 호 : 주식회사 아 산

대 표 자 : 진 익 주 (인)



5. 동 원 인 원 계 획 표

동원인력산출표


공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사

공 종	계	착수 20 일	착수 40 일	착수 60 일	착수 80 일	착수 100 일	착수 120 일	비 고
보통인부	213			53	53	53	53	
특별인부	407			102	102	102	102	
소 계	620	0	0	155	155	155	155	
누 계	620	0	0	155	310	465	620	

주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층

상 호 : 주식회사 아 산

대 표 자 : 진 익 주 (인)



6. 장 비 투 입 계 획 서

장비투입계획서

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

장비명	착수20일	착수40일	착수60일	착수80일	착수100일	착수120일	계	비고
노면파쇄기			1				1	
로더(타이어)			5				5	
아스팔트 피니셔			1				1	
머캐덤롤러			1				1	
타이어롤러			1				1	
탠덤롤러			1				1	
굴착기(타이어)			3				3	
쿠커			10				10	
살수차			1				1	
QRA장비				3	2	2	7	
유압잭				55	55	55	165	

주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층

상 호 : 주식회사 아 산

대 표 자 : 진 익 주 (인)



7. 착 공 전 사 진 대 지

국도46호선 호평IC(상)등 포장 및 시설물보수공사
착 공 전 사 진 대 지

2026. 04.

[주] 아 산

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

호평IC(상) 아스팔트 포장,교면방수



내 용

신구운교(춘천)

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

신구운교(춘천)



내 용

신구운교(춘천)

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

조종교



내 용

조종교

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

사능1교(하)



내 용

사능1교(하)


착공전사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

적성교

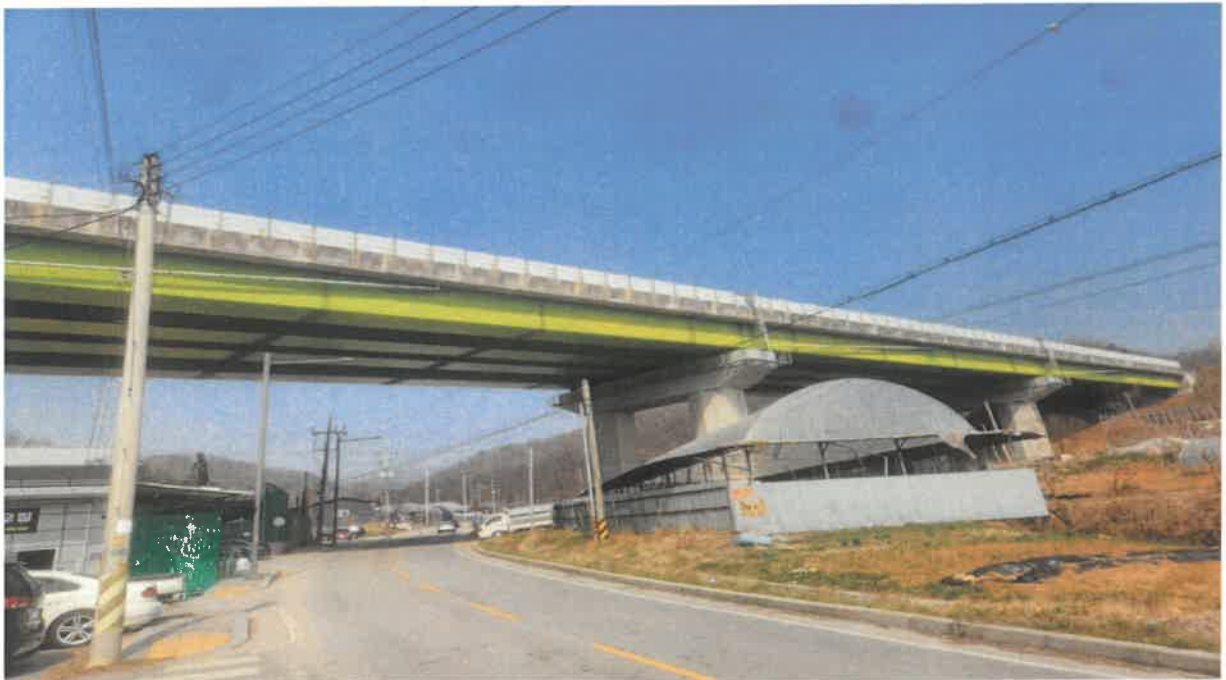

내 용

적성교

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

적성교




내 용

적성교

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사

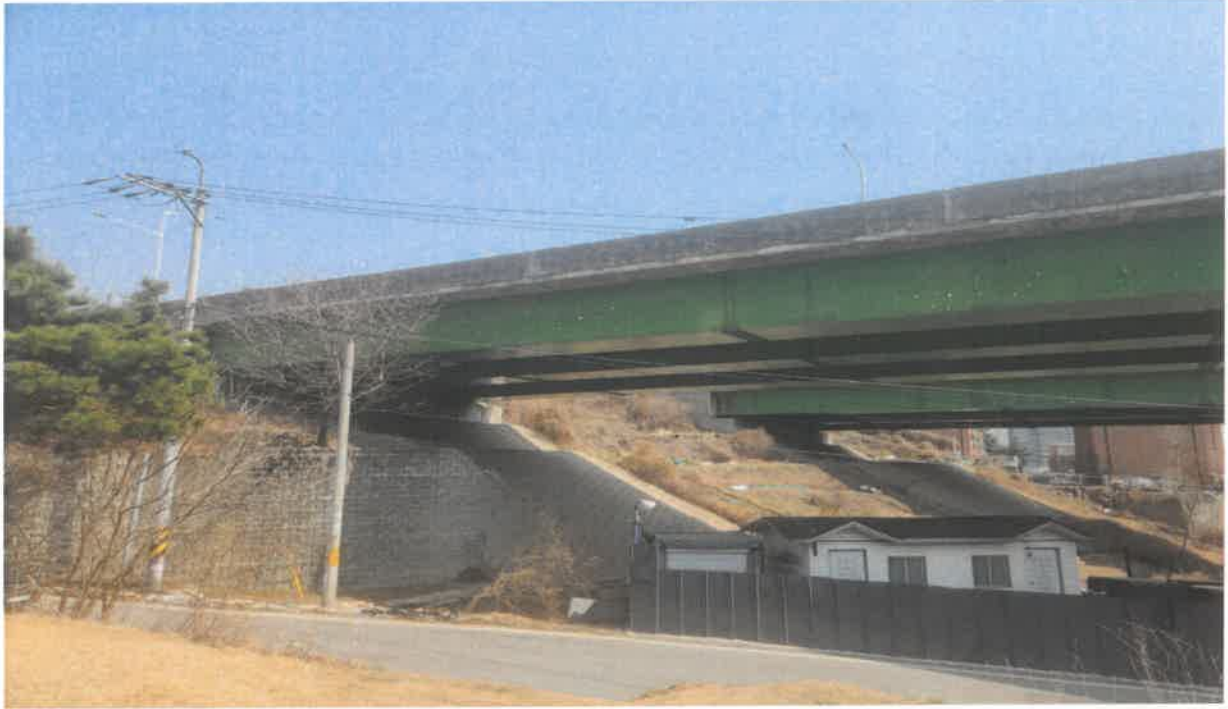

내 용

호평IC(상)



내 용


호평IC(상)

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

호평IC(상)

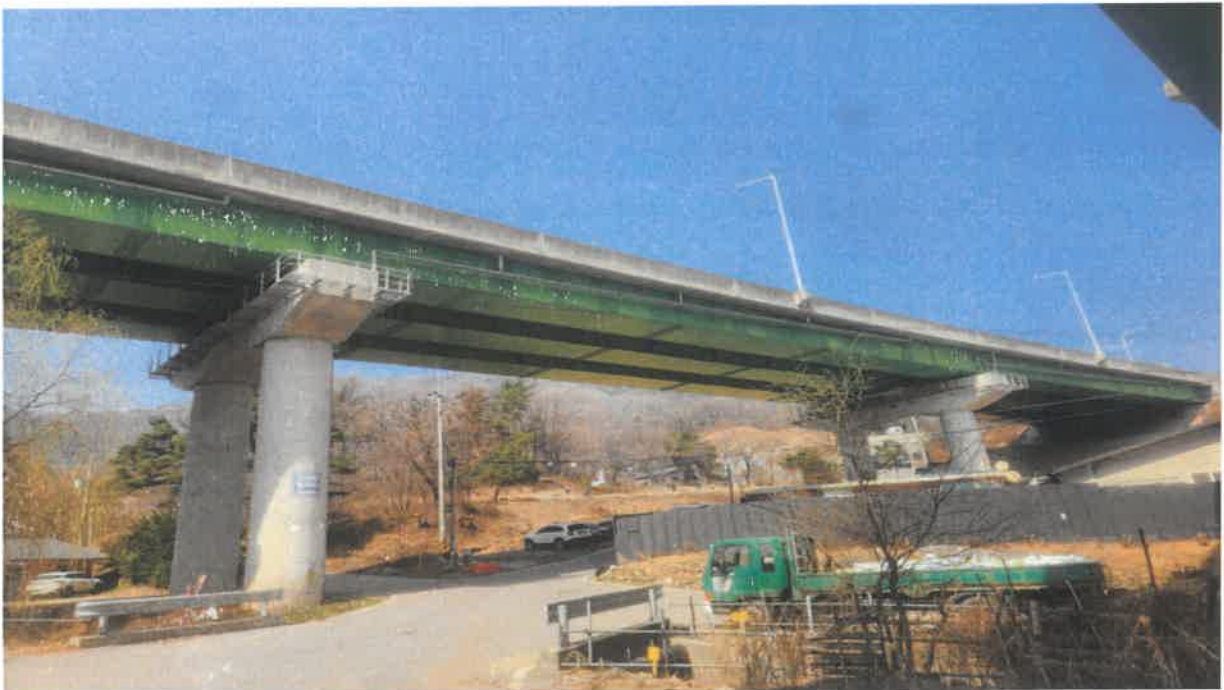

내 용

호평IC(상)

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용	호평 IC(하)
-----	----------



내 용	호평 IC(하)
-----	----------

착공전 사진대지

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사



내 용

호평 IC(하)



내 용

호평 IC(하)

8. 공사도급계약서 사본 및 계약내역서



공사계약서



※ 원본 확인용 QR코드

2026년 03월 27일

<계약자>

<발주처>

기관명 : 국토교통부 서울지방국토관리청 의정
부국토관리사무소
계약관 직책 : 의정부국토관리사무소 분임재무관 계약관 : 조한석
담당 부서 : 운영지원과 담당 : 한가영 (Tel: 031-820-1709)



<계약상대자>

상 호 주식회사 아산 사업자등록번호 132-81-13913
주 소 (우: 12249) 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123 (다산동) 전 화 번 호 031-564-9408
대 표 자 진익주 F A X 031-564-9403

<수요기관>

기 관 명 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소
주 소 경기도 의정부시 송산로 1153-0 (용현동) 전 화 번 호 031-820-1709
담 당 자 한가영 F A X 031-848-9919

계약유형 :	공사	계약방법 :	제한경쟁		
계약법구분 :	국가계약법	조항호 :	(제21조제1항6호) 재정경제부령 금액미만시 영업소재지(지역제한)		
계약번호 :	R26TA01673601-00	관리번호 :	R26DC00184986	기관관리번호 :	
계약일자 :	2026/03/27	공동도급방식 :	단독계약		
계약건명 :	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사				
계약금액 :	일금 오억칠천일백이만이천칠백 원 (₩	571,022,700)			
총부기계약금액 :	일금 오억칠천일백이만이천칠백 원 (₩	571,022,700)			
상호시장 진출허용 여부 :	비대상	현장 :	경기도		
착공일자 :	2026/04/01	금차준공일자 :	2026/07/29	총준공일자 :	2026/07/29
공사기간 :	착공일로부터 금차 120일, 총공사 120일				
검사기관 :					
계약보증금 :	일금 팔천오백육십오만삼천사백 원 (₩	85,653,405)	계약보증금율 :	15 %	
계약보증서 전자제출여부 :	전자접수 및 직접수납	면세사업여부 :	부가세율 :	10 %	

대한민국
수입인자
2026.03.27
10:50:55
고유번호
2609967-036728843
수입인지금액



이행보증서 :

하자보수
보증금율: 3 % 하자담보책임
기간(비고): 단면복구,교면방수3년

하자보수보증금
납부안내사항:

지체상금율: 0.05 % 물가변동적용기
준: 지수조정을

계약해지여부: N 계약해지일자:

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권	₩	570,000	지방채매입액	₩	(해당없음)
인지세과세 대상여부	Y		인지세액	₩	150,000

[계약업체 정보]


대표 (단독계약)	상 호	주식회사 아산	사업자등록번호	132-81-13913
	주 소	(우: 12249) 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123 (다산동)	전 화 번 호	031-564-9408
	대 표 자	진익주	F A X	031-564-9403
	공 종	토목공사업	지 분 율	100 %

위 공사계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확약하며 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 공사입찰유의서, 공사입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서 및 현장설명 사항과 공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 불임 전자계약 확약사항이 이 계약의 일부분임을 확인하며 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.

[첨부문서]

No.	문서유형	파일명/링크
1.	공고서	(제2026-86호)입찰공고문(국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사).hwp
2.	계약체결 안내문	(공사)계약제출서류.zip



계 약 내 역 서

공 사 명 : 국도46호선 호평ic교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

전 체 계 약 금 액 : 일금 오억칠천일백이만이천칠백원정 (₩ 571,022,700)

공 사 개 요 : 호평 ic교(상) : 아스팔트 포장 절삭 후 덧씌우기, 국도46호선 신구운교 외 5개소 : 단면보수

위 공사에 대하여 붙임과 같이 계약내역서를 제출합니다.

2026년 03 월 27 일

상 호 : 주식회사 아 산 대 표 자 : 진 익 주

주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층

의정부국토관리사무소장 귀하



내역서총괄표

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액	비 고
1.	국도46호선 호평IC교(상)				181,183,936	
2.	국도46호선 신구운교 등				141,578,586	
	순 공 사 비				322,762,522	
	간접노무비		1	식	30,939,448	
	산재보험료		1	식	7,776,864	
	고용보험료		1	식	2,206,356	
	건강보험료		1	식	7,437,746	
	연금보험료		1	식	9,827,342	
	노인장기요양보험료		1	식	977,319	
	퇴직공제부금비		1	식	4,758,502	
	건설기계대여금지급보증서발급액		1	식	1,291,049	
	산업안전보건관리비		1	식	12,397,587	
	환경보전비		1	식	2,904,862	
	하도급대금지급보증수수료		1	식	261,437	
	기타경비		1	식	16,940,698	
	순공사원가		1	식	420,481,732	
	일반관리비		1	식	33,638,537	
	이윤		1	식	46,652,366	
	안전관리계획서 작성				17,884,603	
	폐기물처리비				454,308	
	총원가				519,111,546	
	부가가치세		10	%	51,911,154	
	도급예정액				571,022,700	
	관급자재대				37,700,000	
	총공사비				608,722,700	

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
1.	국도46호선 호평IC교(상)					181,183,936	
1-1	호평 IC교 (상)					181,183,936	
1-1-1	아스팔트 포장 절삭 후 덧씌우기					173,186,989	
	아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기	A-Type (1회절삭,2회포장)-야간작업	1,969	m²	6,368	12,538,592	90.627%
	교면방수	JJ 시트식 복합 교면방수 (야간)	1,969	m²	80,540	158,583,260	90.627%
	교면물빼기 유공관	Φ 15mm,그물망형, 야간	125	M	11,301	1,412,625	90.627%
	아스팔트유제	RSC-4	4	D/M	163,128	652,512	90.627%
1-1-3	부대공					7,996,947	
	차선도색(용착식,일반형)-운행도로,차량부분통제	수동식,백색실선	65	m²	24,905	1,618,825	90.627%
	차선도색(용착식,일반형)-운행도로,차량부분통제	수동식,백색파선	5	m²	29,457	147,285	90.627%
	차선도색(용착식,일반형)-운행도로,차량부분통제	수동식,문자.기호	72	m²	41,739	3,005,208	90.627%
	교통안전관리비	야간	1	일	882,668	882,668	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	중기운반	아스콘포장	1	식	1,996,896	1,996,896	90.627%
	품질시험비	연성포장	1	식	212,052	212,052	
2.	국도46호선 신구운교 등					141,578,586	
2-1	신구운교(춘천)					6,196,197	
2-1-1	보수공					2,794,732	
	방호벽 및 중분대					805,140	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	2	m²	402,570	805,140	90.627%
	바닥판 하면					1,027,981	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	10	m²	91,558	915,580	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	3	m	37,467	112,401	90.627%
	교대					76,993	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	1	m²	76,993	76,993	90.627%
	교각					884,618	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	8	m²	76,993	615,944	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	268,674	268,674	90.627%
2-1-2	부대공					3,401,465	
	굴절차	22M (야간)	1	일	2,380,766	2,380,766	90.627%
	교통안전관리비	야간	1	일	882,668	882,668	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7m³	1	m³	4,018	4,018	90.627%
2-2	조종교					22,033,531	
2-2-1	보수공					15,368,632	
	바닥판 하면					10,867,846	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	84	m²	91,558	7,690,872	90.627%
	단면보수(SSR공법)	천정T=10mm (야간)	10	m²	150,553	1,505,530	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	4	m²	417,861	1,671,444	90.627%
	교대					2,329,838	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	14	m²	76,993	1,077,902	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=10mm (야간)	6	m²	133,722	802,332	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	12	m	37,467	449,604	90.627%
	교각					2,170,948	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	25	m²	76,993	1,924,825	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=10mm (야간)	1	m²	133,722	133,722	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	3	m	37,467	112,401	90.627%
2-2-2	부대공					6,664,899	
	굴절차	22M (야간)	2	일	2,380,766	4,761,532	90.627%
	교통안전관리비	야간	2	일	882,668	1,765,336	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7m³	1	m³	4,018	4,018	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
2-3	사능1교(상)					44,320,015	
2-3-1	보수공					33,405,996	
	방호벽 및 중분대					8,787,711	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	90	m²	76,993	6,929,370	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	5	m²	268,674	1,343,370	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	m²	402,570	402,570	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	3	m	37,467	112,401	90.627%
	바닥판 하면					12,272,026	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	38	m²	91,558	3,479,204	90.627%
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	13	m²	287,771	3,741,023	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	12	m²	417,861	5,014,332	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	1	m	37,467	37,467	90.627%
	교대					4,418,060	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	50	m²	76,993	3,849,650	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	268,674	268,674	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	8	m	37,467	299,736	90.627%
	교각					7,928,199	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	48	m²	76,993	3,695,664	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	13	m²	268,674	3,492,762	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	m²	402,570	402,570	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	9	m	37,467	337,203	90.627%
2-3-2	부대공					10,914,019	
	굴절차	22M (야간)	3	일	2,380,766	7,142,298	90.627%
	교통안전관리비	야간	4	일	882,668	3,530,672	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7m³	2	m³	4,018	8,036	90.627%
	품질시험비	압축강도, 부착강도	1	식	99,000	99,000	
2-4	사능1교(하)					24,767,033	
2-4-1	보수공					17,219,466	
	방호벽 및 중분대					6,928,430	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	20	m²	76,993	1,539,860	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	18	m²	268,674	4,836,132	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	m²	402,570	402,570	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	4	m	37,467	149,868	90.627%
	바닥판 하면					5,947,226	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	25	m²	91,558	2,288,950	90.627%
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	11	m²	287,771	3,165,481	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	1	m²	417,861	417,861	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	2	m	37,467	74,934	90.627%
	교대					1,461,036	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	15	m²	76,993	1,154,895	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	268,674	268,674	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	1	m	37,467	37,467	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
	교각					2,882,774	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	26	m²	76,993	2,001,818	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	3	m²	268,674	806,022	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	2	m	37,467	74,934	90.627%
2-4-2	부대공					7,547,567	
	굴절차	22M (야간)	2	일	2,380,766	4,761,532	90.627%
	교통안전관리비	야간	3	일	882,668	2,648,004	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7m³	1	m³	4,018	4,018	90.627%
2-5	적성교					7,562,038	
2-5-1	보수공					4,160,573	
	방호벽 및 중분대					825,230	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	2	m²	76,993	153,986	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	268,674	268,674	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	m²	402,570	402,570	90.627%
	바닥판 하면					1,765,796	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	13	m²	91,558	1,190,254	90.627%
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	2	m²	287,771	575,542	90.627%
	교대					576,646	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	4	m²	76,993	307,972	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	268,674	268,674	90.627%
	교각					992,901	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	6	m²	76,993	461,958	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	268,674	268,674	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	7	m	37,467	262,269	90.627%
2-5-2	부대공					3,401,465	
	굴절차	22M (야간)	1	일	2,380,766	2,380,766	90.627%
	교통안전관리비	야간	1	일	882,668	882,668	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7㎡	1	㎡	4,018	4,018	90.627%
2-6	호평 IC교(상)					17,500,697	
2-6-1	보수공					13,216,564	
	방호벽 및 중분대					7,236,054	
	표면보수(SSR공법)	벽체	18	㎡	57,859	1,041,462	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	21	㎡	268,674	5,642,154	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	402,570	402,570	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	4	m	37,467	149,868	90.627%
	바닥판 하면					2,863,095	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	19	㎡	91,558	1,739,602	90.627%
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	1	㎡	287,771	287,771	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	2	㎡	417,861	835,722	90.627%
	교대					2,732,450	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	32	㎡	76,993	2,463,776	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	㎡	268,674	268,674	90.627%
	교각					384,965	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	5	㎡	76,993	384,965	90.627%
2-6-2	부대공					4,284,133	
	굴절차	22M (야간)	1	일	2,380,766	2,380,766	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
	교통안전관리비	야간	2	일	882,668	1,765,336	90.627%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7㎡	1	㎡	4,018	4,018	90.627%
2-7	호평 IC교(하)					19,199,075	
2-7-1	보수공					12,534,176	
	방호벽 및 중분대					3,547,613	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	26	㎡	76,993	2,001,818	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	3	㎡	268,674	806,022	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	402,570	402,570	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	9	m	37,467	337,203	90.627%
	바닥판 하면					1,873,748	
	표면보수(SSR공법)	천정	11	㎡	68,205	750,255	90.627%
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	1	㎡	287,771	287,771	90.627%
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	2	㎡	417,861	835,722	90.627%
	교대					3,656,138	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	47	㎡	76,993	3,618,671	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	1	m	37,467	37,467	90.627%
	교각					3,456,677	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	38	㎡	76,993	2,925,734	90.627%
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	㎡	268,674	268,674	90.627%
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	7	m	37,467	262,269	90.627%
2-7-2	부대공					6,664,899	
	굴절차	22M (야간)	2	일	2,380,766	4,761,532	90.627%
	교통안전관리비	야간	2	일	882,668	1,765,336	90.627%

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	134,013	134,013	90.627%
	폐기물상차	백호0.7㎡	1	㎡	4,018	4,018	90.627%
	순 공 사 비					322,762,522	
	간접노무비		16.5	%		30,936,796	
	산재보험료		3.56	%		7,776,198	
	고용보험료		1.01	%		2,206,168	
	건강보험료		3.595	%		6,740,471	
	연금보험료		4.75	%		8,906,047	
	노인장기요양보험료		13.14	%		885,697	
	퇴직공제부금비		2.3	%		4,312,401	
	건설기계대여금지급보증서발급액		0.4	%		1,291,050	
	산업안전보건관리비		2.53	%		11,625,999	
	환경보전비		0.9	%		2,904,862	
	하도급대금지급보증수수료		0.081	%		261,437	
	기타경비		5.2	%		16,939,257	
	순공사원가					417,548,905	
	일반관리비		8	%		33,403,912	
	이윤		14.88	%		51,113,990	
	총원가					520,405,718	
	부가가치세		10	%		52,040,571	
	도급예정액					572,446,289	
	총공사비					610,146,289	

계약내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	도 급 금 액		비 고
					단 가	금 액	
3.	안전관리계획서작성					17,884,603	
	안전관리책임자	공사기간(투입일 정산)	60	일	235,459	14,127,540	
	안전관리계획서작성비		1	식	3,757,063	3,757,063	
4.	폐기물처리비					454,308	
	폐기물처리비	폐콘크리트	9.86	Ton	28,223	278,278	90.627%
	폐기물운반비(상차제외)	30km이하, 덤프15톤	9.86	Ton	17,853	176,030	90.627%
5.	관급자재대					37,700,000	
5-1	호평IC교(상)					37,645,120	
	아스콘(관급)-서울,인천,경기(강북,노원,도봉구 제	조합공통품목, WC-6, 가열, 1등급	376	톤	100,120	37,645,120	관급
5-2	단수조정		1	식	54,880	54,880	

제 경 비 산 출 내 역 서

공사명 : 국도46호선 호평1교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

공 종 명	설계금액	도급금액	산 출 근 거	비 고
가. 직접공사비	356,120,488	322,762,522		
1.간 접 노 무 비	34,137,084	30,939,448	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 34,137,084 = 30,939,448 ≒ 30,939,448	
2.산 재 보 험 료	8,580,614	7,776,864	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 8,580,614 = 7,776,864 ≒ 7,776,864	
3.고 용 보 험 료	2,434,387	2,206,356	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 2,434,387 = 2,206,356 ≒ 2,206,356	
4.건 강 보 험 료	7,437,746	7,437,746	설계가 반영	≒ 7,437,746
5.연 금 보 험 료	9,827,342	9,827,342	설계가 반영	≒ 9,827,342
6.노인장기요양보험료	977,319	977,319	설계가 반영	≒ 977,319
7.퇴직공제부금비	4,758,502	4,758,502	설계가 반영	≒ 4,758,502
8.건설기계대여대금	1,424,481	1,291,049	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 1,424,481 = 1,291,049 ≒ 1,291,049	
9.산 업 안 전 보 건 관 리	12,397,587	12,397,587	설계가 반영	≒ 12,397,587
10.환 경 보 전 비	3,205,084	2,904,862	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 3,205,084 = 2,904,862 ≒ 2,904,862	
11.하도급대금지급보증수	288,457	261,437	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 288,457 = 261,437 ≒ 261,437	
12.기 타 경 비	18,691,544	16,940,698	(322,762,522 ÷ 356,120,488) × 18,691,544 = 16,940,698 ≒ 16,940,698	
나. 소 계	460,280,635	420,481,732		
13.일 반 관 리 비	36,822,450	33,638,537	(420,481,732 ÷ 460,280,635) × 36,822,450 = 33,638,537 ≒ 33,638,537	
14.이 윤	56,329,192	46,652,366	(420,481,732 ÷ 460,280,635) × 56,329,192 = 51,458,598 ≒ 46,652,366	이윤조정
15.안전관리계획서작성	17,884,603	17,884,603	설계가 반영	≒ 17,884,603
16.폐기물처리비	501,302	454,308		
라. 공 급 가 액	571,818,182	519,111,546		
17.부 가 가 치 세	57,181,818	51,911,154		
마. 도 급 공 사 비	629,000,000	571,022,700		

적 용 제 경 비 산 출 서

구 분	도급금액	산 출 근 거	적용 제경비율	비 고
- 순공사비 = 직접공사비	322,762,522			
가. 간접노무비	30,939,448	(30,939,448 ÷ 322,762,522) = 9.585824%	순공사비 × 9.585824%	
나. 산재보험료	7,776,864	(7,776,864 ÷ 322,762,522) = 2.409469%	순공사비 × 2.409469%	
다. 고용보험료	2,206,356	(2,206,356 ÷ 322,762,522) = 0.683584%	순공사비 × 0.683584%	
라. 건강보험료	7,437,746	(7,437,746 ÷ 322,762,522) = 2.304401%	순공사비 × 2.304401%	
마. 연금보험료	9,827,342	(9,827,342 ÷ 322,762,522) = 3.044759%	순공사비 × 3.044759%	
바. 노인장기요양보험료	977,319	(977,319 ÷ 322,762,522) = 0.302798%	순공사비 × 0.302798%	
사. 퇴직공제부금비	4,758,502	(4,758,502 ÷ 322,762,522) = 1.474304%	순공사비 × 1.474304%	
아. 건설기계대여대금지급보증사	1,291,049	(1,291,049 ÷ 322,762,522) = 0.399999%	순공사비 × 0.399999%	
자. 산업안전보건관리비	12,397,587	(12,397,587 ÷ 322,762,522) = 3.841086%	순공사비 × 3.841086%	
차. 환경보전비	2,904,862	(2,904,862 ÷ 322,762,522) = 0.899999%	순공사비 × 0.899999%	
카. 하도급대금지급보증수수료	261,437	(261,437 ÷ 322,762,522) = 0.080999%	순공사비 × 0.080999%	
타. 기타경비	16,940,698	(16,940,698 ÷ 322,762,522) = 5.248657%	순공사비 × 5.248657%	
1. 순공사원가	420,481,732			
2. 일반관리비	33,638,537	(33,638,537 ÷ 420,481,732) = 7.999999%	순공사원가 × 7.999999%	
3. 이 윤	46,652,366	(46,652,366 ÷ 420,481,732) = 11.094980%	순공사원가 × 11.094980%	
4. 안전관리계획서작성	17,884,603			
5. 폐기물처리비	454,308			
공 급 가 액	519,111,546			
6. 부가가치세	51,911,154			
1.도 급 액	571,022,700			

9. 품 질 시 험 계 획 서

품 질 시 험 계 획 서

국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

2026. 04

(주) 아 산

목 차

1. 개 요

- 가. 공 사 명
- 나. 시 공 자
- 다. 현장대리인
- 라. 공사개요

2. 품질시험계획 및 횟수

3. 시험시설

- 가. 품질관리실 시험기구
- 나. 품질관리실 장비운영계획
- 다. 품질관리실 배치 평면도

4. 품질관리자 배치계획

- 가. 품질관리자 현황
- 나. 기술자 자격 사항

품질시험계획서

1. 개 요

가. 공 사 명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물 보수공사

- 공사기간 : 2026년 04월 01일 ~ 2026년 07월 29일

- 공사금액 : 일금 오억칠천일백이만이천칠백원정 (₩571,022,700)

나. 시 공 자 : 주식회사 아 산

다. 현장대리인

직 책	성 명	등 급	기술자격	연락처
현장대리인	유 병 화	고급	토목고급(92201020128R)	010-5217-4996

라. 공사개요

공 종	단 위	수 량	비 고
절삭후 아스팔트 덧씌우기	m2	1,969	
표면보수	m2	676	
단면보수	m2	114	
주입보수	m	76	

2. 품질시험계획 및 횟수

공종	종별		시험종목	시험방법	시험빈도	시험계 획 물량	단 위	계획시험횟수				산출근거	비고
								계	자체	의뢰	KS 등		
총계								2		2			
교면포장공	현장 시험	절삭후 아스팔트 덧씌우기	밀도, 두께	시료채취후 외부의뢰	1회/3,000 m2	1,969	m2	1		1		1,969m2/3,000m2 =1회	외부의뢰
			코아채취	시료채취후 외부의뢰									
단면보수공	현장 시험	단면보수	압축, 부착 강도	시료채취후 외부의뢰	재료별1회	90	m2	1		1		재료별1회	외부의뢰

[illegible]

나. 품질관리실 장비 운영계획

- 각각의 공종에 필요한 시험장비에 대하여 공사착공 즉시 품질관리실내에 배치할 계획
(필요한 시험기기는 해당 공종의 작업전 구비 예정)
- 시험실내 자체 시험 불가능한 건설자재에 대해서는 시공전에 품질검사전문기관에 시험의뢰를
실시하여 품질관리에 만전을 기하겠음
- 교정대상 시험기기 및 장비의 교정주기 및 교정일자는 표-1에 명기함

표-1

순 위	공 종	시험기구명	교정주지	교정일자	비고
- 해 당 없 음 (외 부 의 퇴) -					

다. 품질관리실 장비 운영계획

- 본 공사의 품질시험의 경우 국가공인 품질시험검사 전문기관 한국건설기술시험연구원에서
요구하는 품질시험을 실시함, 이에 현장의 별도의 품질시험실을 운영하지 않음.
- 한국건설기술시험연구원 위치 : 경기도 화성시 안녕길24번길 6

4. 품질관리자 배치계획

가. 품질관리자 현황

직 책	성 명	등 급	기 술 자 격	주민등록번호	연락처
이 사	이 인 근	품질초급	품질관리초급기술자 (23401290936B)	630612-1*****	010-7103-0038

나. 기술자 자격 사항

▶첨부 : 건설기술자(품질관리자)경력증명서

품질관리자선임계

1. 성 명 : 이인근
2. 생 년 월 일 : 1961.02.28
3. 주 소 : 경기도 고양시 덕양구 오부자로 15
4. 자 격 증 번 호 : 23401290936B(#1003999)
5. 종 목 및 등 급 : 품질 초급

상기인을 " 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물보수공사" 의 품질관리자로
선정하고 이에 품질관리자 선임계를 제출합니다.

2026년 04월 01일

경 기 도 남 양 주 시 다 산 중 앙 로 146 번 길 70-123, 2 층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

재 직 증 명 서

성 명	이인근	생 년 월 일	1961.02.28
주 소	경기도 고양시 덕양구 오부자로 15		
부 서 명	시 공 부	직 책	이 사
재 직 기 간	2022년 02월 07일 부터 현재까지		
사 용 용 도	품질관리자 선임계		

위와 같이 당사에 재직하고 있음을 증명함.

2026년 04월 01일

경기도 남양주시 다산중앙로 146번길 70-123, 2층
주 식 회 사 아 산
대 표 이 사 진 익 주 (안)



의정부국토관리사무소장 귀하

2026년 04월 08일

한국건설기술인협회장

(3쪽 중 제1쪽)

건설기술인 경력증명서

관리번호 # 1 0 0 3 9 9 9	발급번호	20260408 - C02427064			
인적사항	성명(한글) 이인근	(한자) 李仁根	생년월일	61.02.28	
	주소 경기 고양시 덕양구 오부자로 15 102동 2802호(지축동, 지축역한림플에버)				
등급	설계·시공 등	건설사업관리		품질관리	
	직무분야	전문분야	직무분야	전문분야	
	토목 초급	토목시공 초급	** 생략 **	** 해당없음 **	초급
국가 기술자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일
	거꾸집기능사	2023.04.19	23401290936B		
학력	졸업일	학교명	학과(전공)		학위
	** 해당없음 **				
교육훈련	교육기간	과정명		교육기관명	교육인정여부
	2024.05.11 ~ 2024.08.22 2024.04.19 ~ 2024.05.10	설계시공기술인최초초급전문교육(원격교육) 설계시공기술인최초초급기본교육(원격교육)		건설기술교육원 건설기술교육원	설계·시공 설계·시공
「건설기술 진흥법 시행령」 별표 3 제2호나목1)나),2)나)(1)·(2) 및 3)나)에 따른 의무교육 이수 시간 - 설계·시공 등 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육:					
상훈	수여일	수여기관		종류 및 근거	
	** 해당없음 **				
벌점 및 제재사항	벌점	*해당없음*		근거	제재기관
	제재일	종류 및 제재기간 ** 해당없음 **			
근무처	근무기간	상호		근무기간	상호
	2016.03.02 ~ 2017.03.10	에스지신성건설(주)		2022.02.07 ~ 근 무 중	(주)아산



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용 · 복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2016.03.02 ~ 2017.03.10 (374일)	아산신도시배방지구오피스텔신축사업		토목	시공	
	한국자산신탁(주)		토목시공	부장	
			참여기술인		
2022.02.07 ~ 2023.07.24 (533일)	남양주 도농그린공원 민간개발 조성공사		토목	시공	
	(주)디트루		토목시공	이사	
			참여기술인		
2023.07.25 ~ 2023.07.25 (1일)	본사/관리부		토목	본부공무	
				이사	
2023.07.26 ~ 2023.08.08 (14일)	남양주 도농근린공원 민간개발 조성공사		토목	시공	
	(주)디트루		토목시공	이사	
			참여기술인		
2023.08.09 ~ 2026.03.31 (966일)	본사/업무부		토목	본부공무	
				이사	
2026.04.01 ~ 2026.04.03 (3일)	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사		토목	시공	
	의정부국토관리사무소		토목시공	이사	
			현장대리인		



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
2026.04.04 ~ 근 무 중 (4일)	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사		토목	품질관리	
	의정부국토관리사무소		토목품질관리	이사	
			품질관리자		

※ 적용 용·복합건설기술란, 적용 신기술 등란 및 시설물 종류란은 발주청(인·허가기관)의 확인으로 신고된 사항만을 적으며, 미신고된 란은 생략 가능합니다.

KOCEA



본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술인협회 홈페이지(www.kocea.or.kr)의 발급증명서확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서 확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

2. 건설사업관리 및 감리경력

※ 「건설기술 진흥법 시행령」 제45조제1항, 제2항 및 제5항에 따라 통보되는 건설사업관리용역 및 감리용역 참여 경력만 해당합니다.

참여기간 (인정일)	사업명		직무분야	담당업무	비고
	발주자	공사종류	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
	적용 공법	적용 용·복합건설기술	적용 신기술 등	시설물 종류	
~ (일)	*** 해당 없음 ***				

※ 적용 용·복합건설기술란, 적용 신기술 등란 및 시설물 종류란은 발주청(인·허가기관)의 확인으로 신고된 사항만을 적으며, 미신고된 란은 생략 가능합니다.

○ 건설사업관리 업무 수행기간 : 0 일

- 상 주 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]
 - 기술지원 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]

○ 감리 업무 수행기간 : 0 일

- 상 주 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]
 - 기술지원 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]

○ 건설사업관리기술인으로서 안전관리 업무 수행기간 : 0 일

※ 업무 수행 중복기간은 건수로 나누어 산정하여 기록함

○ 건설사업관리 및 감리(최근 1년간) 용역 완성비율 : 0 % (참여건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건, 완료건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건)

3. 배치금지(「건설기술 진흥법 시행규칙」 제27조제2항제4호에 따라 철수한 경우만 기재)

용역명	근무형태	직책	근무기간	배치금지 기간
** 해당없음 **			~	~



분야별 참여기간 인정일 및 건설기술진흥법령 외 자격·학력 등

1. 분야별 참여기간 인정일

공사종류별 인정일수 현황		직무/전문분야별 인정일수 현황	
기타(본사근무)	967 일	토목/토목시공	924 일
기타(미기재)	928 일	토목/토목품질관리	4 일
인정일수 합계	1,895 일	토목/(미기재)	967 일
		인정일수 합계	1,895 일

※ 기술경력의 참여기간이 중복된 경우 인정일수 산정시 소수점이하를 절삭하여 공사종류별 인정일수 합계와 직무/전문분야별 인정일수 합계의 차이가 있을 수 있습니다.

※ 공사종류별 인정일수 현황 중 공사종류를 2종이상으로 신고한 경우, 가나다순으로 정렬 후 합산 표기하였습니다.

2. 건설기술진흥법령 외 자격·학력·교육훈련 및 상훈

자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
	** 해당없음 **					
학력	졸업일	학교명	학과(전공)	학위		
	** 해당없음 **					
교육훈련	교육기간	교육기관명	과정명			
	** 해당없음 **					
상훈	수여일	수여기관	종류 및 근거			
	** 해당없음 **					

※ 위 사항은 건설기술 진흥법령에 따른 관리대상에 해당하지 않으며, "건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준(국토교통부 고시)" 제17조제6항 후단에 따라 진위여부는 확인되지 않은 사항입니다.



10. 안 전 관 리 계 획 서

안 전 관 리 계 획 서

국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사


2026. 04

(주) 아 산

1. 안전관리 계획 조직구성 및 교육 계획

1-1. 인원조직 및 업무분장

1-1-1. 조직도

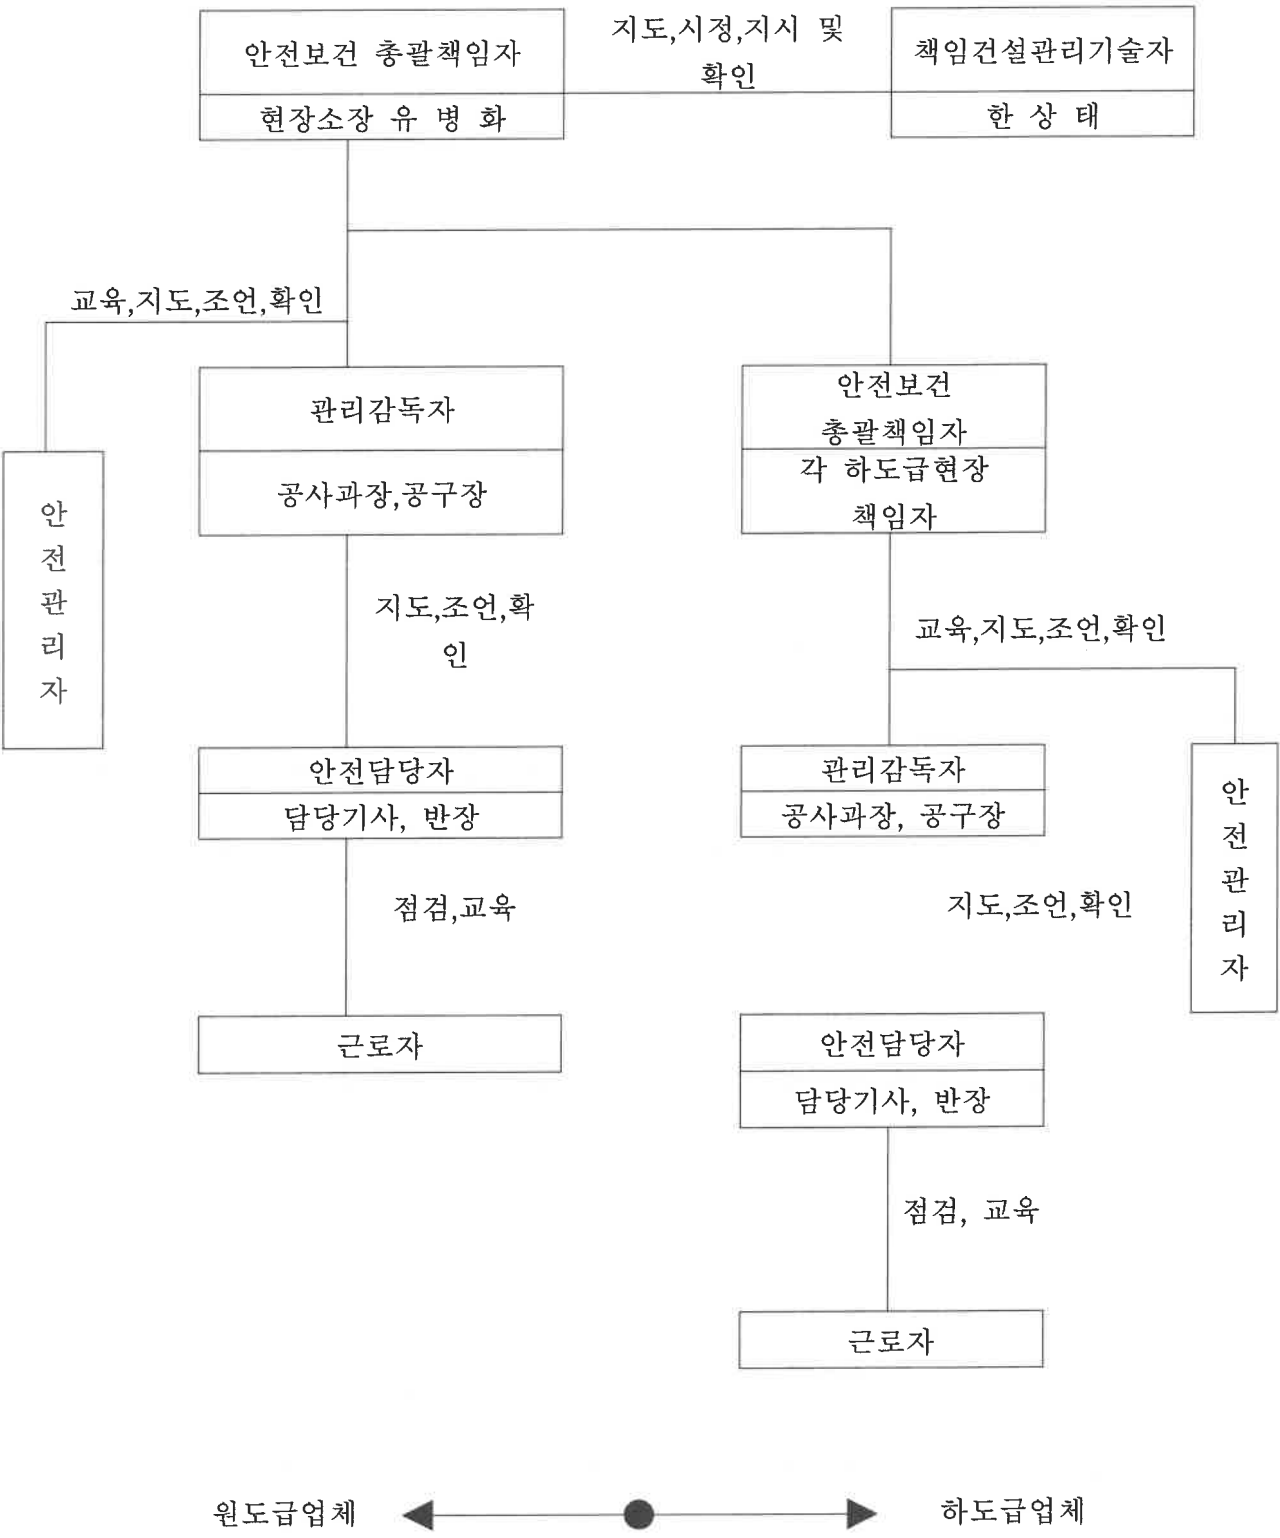

1-1-2. 조직의 업무분장

1) 안전보건총괄책임자

- * 작업중지 및 재개
- * 안전보건수칙 제정
- * 수급업체의 표준안전관리비 집행감독 및 협의 조정
- * 기계, 기구설비의 사용확인
- * 안전관리자의 제반 보고사항에 대한 의견 수렴 및 지시
- * 법령에 의한 의무사항 수행

2) 안전관리자

- * 사업장 안전보건관리 규정상 직무수행
- * 방호장치, 기계장치, 보호구 선정
- * 안전교육계획 수립 및 실시
- * 사업장 순회점검, 지도 및 조치의 건의
- * 산업재해발생 원인조사 및 대책 수립
- * 법령상 규정된 안전관리사항 위반 근로자에 대한 조치의 건의

3) 관리감독자

- * 사업장내 관리감독자가 주관하는 작업과 관련된 기계, 기구 및 설비의 안전보건점검 및 이상확인
- * 소속된 근로자의 개인보호구 착용상태, 건강상, 이상여부, 복장, 소지공구의 안전과 관련된 교육계획수립
- * 사업장내의 산업재해발생시 응급조치 수행 및 보고
- * 작업장의 정리정돈 및 통로확보 감독
- * 산업보건의, 안전관리자, 보건관리자의 지도, 자문에 대한 협조 의무
- * 기타 법령에 의한 의무사항의 이행

4) 안전담당자

- * 사업장내 작업과 관련된 기계, 기구 및 설비의 안전보건 점검 및 이상유무
- * 소속된 근로자의 개인보호구 착용상태, 건강상 이상여부, 복장, 소지공구의 안전과 관련된 일일점검 실시

- * 소속인원의 산업재해 발생시 응급조치 수행 및 보고
- * 작업장의 정리정돈 및 통로확보 감독
- * 안전관리자의 지도,자문에 대한 협조 의무
- * 유해,위험요소에 점한 점검 및 발견시 제거
- * 작업자에 대한 일일 안전교육 실시

1-1-3. 안전보건 협의회

1)구성

- * 회장 : 안전보건관리(총괄)책임자
- * 간사 : 당사 안전관리자
- * 위원 : 각 협력업체 사장 또는 소장, 당사의 관리감독자

2) 회의추진

- * 매월 첫째 수요일에 소집
- * 안전관련 전반사항 토의후 중점추진목표 설정
- * 주요 협의대상 내용
 - 공정별 안전상 문제점 및 대책
 - 안전점검 결과 시정사항
 - 개인보호구 지급에 관한 사항
 - 근로자 건강진단에 관련된 사항 및 비용처리방안
 - 무재해 활동 실적분석을 통한 무재해운동 중점 후 추진사항 설정

1-2. 재해발생시 연락체계관리

● 재해발생 경로

- 1) 근로자의 신체적 결함, 유전적 요소
- 2) 불안정한 작업 환경
- 3) 불안정한 행동
- 4) 사고 발생
- 5) 인적 또는 물적 손실 발생 재해 → 이상 하인리히의 “재해의 도미노 이론”

1-2-1. 재해의 종류별 조치계통

구 분	내 용	조치방안
중대재해 (1급재해)	사망 3개월이상의 가료,요양을 요하는 2인이상의 재해자 동시 발생 동일종류의 부상자가 동시에 10인이상 발생	중대재해사고 처리지침에 준함
2급재해	중상자 발생 재해 물적손실 500만원 이상의 사고 발생	응급조치후 보고 계통도 참조
3급재해	경상자 발생 물적손실 500만원 미만으로 재정상 현장내 처리가 불가한 사고	응급조치후 보고 계통도 참조

1-2-2. 재해발생시의 처리순서

- 1) 응급조치 : 환자 후송, 연사고 발생여부 확인 및 요인 제거
- 2) 사고발생 보고
- 3) 현장보관 및 목격자 확보
- 4) 사고발생 원인 규명 및 사고발생 보고서 작성
- 5) 재발방지 대책 수립 및 전파교육 시행

1-2-3. 재해발생시 처리절차

1) 당사의 긴급조치 수준

- * 즉시 사고 피해자를 후송 후 목격자 확보
- * 관계자 및 유관기관에 통보
- * 2차 재해발생 예방조치
- * 유관기관의 조사전까지 사고 현장 보존

2) 보고체계

- * 현장사무소는 즉시 안전관리부로 유선보고 후 재해속보 제출 : 24시간 내
- * 안전관리부는 조직계통에 의거 담당인원에게 보고

3) 사고대책 수습반 구성

- * 재해속보 접수즉시 안전관리부 주관 결성
 - 반장 : 안전관리부장 또는 위임을 받은 자
 - 반원 : 현장 안전관리자, 공무책임자, 현장관리, 안전관리부 직원, 협력업체 현장소장 및 작업반장

* 사고대책 수습반은 사고원인 재조사후 보고 실시

4) 관련기관 신고 및 대처

* 직영 공사시

- 사고대책 수습반의 지시에 추종
- 재해상 특기사항 있을시는 현장소장이 조치

* 외주 공사시

- 지방노동사무소에 신고는 본사 안전관리부 수행

* 관할 경찰서 신고는 사고발생 협력업체 수행

* 노동사무소 중재에 의한 합의성립시 및 산재사고 보상처리시만 사고 종결 처리함.

1-3. 안전관리 교육계획

1-3-1. 기자재 확보

1) 기자재 준비대상

- * 책상및 의자
- * 교육장소 : 전 근로자 대상시 - 현장사무소 전면 활용
책임자 교육시 - 현장 회의실 활용

1-3-3. 안전교육계획

1) 목적

- * 재해의 1차적 원인요소 제거(신체적 결함,정신적 이상)
- * 계몽및 교육실시
- * 안전작업방법 설정및 지도
- * 안전유지를 위한 지식, 기능및 태도 형성
- * 안전목표및 방침 전파

2) 교육 종류

가. 일일교육

- 대상 : 공종별 각 작업반
- 장소 : 각 작업장
- 시간 : 매일 작업전 5-10분간
- 교육책임자 : 관리감독자및 협력업체 안전담당자
- 교육내용 : 개인건강상태, 개인보호구 착용상태 점검

금일작업내용 관련 위험요소및 대책, 지적및 확인

나. 안점점검의 날 행사(근로자 정기안전보건교육)

- 대상 : 전 근로자(인원과다시 공종별 분리 또는 협력업체별 자체교육 실시)
- 장소 : 안전교육장
- 시간 : 매월 1회 2시간 이상
- 교육책임자 : 안전보건총괄책임자,관리감독자및 협력업체 안전담당자
- 주관 : 당사 현장 안전관리자
- 교육내용 : 개인보호구의 중요성및 착용방법

최근건설재해 동향및 우수근로자 표창

다. 월간안전교육(관리감독자 정기교육)

- 대상 : 관리감독자, 안전담당자, 협력업체 안전담당자
- 장소 : 외부 의뢰 - 분기별 1회, 자체 시행 _ 월 1회
- 시간 : 매월 2째 토요일 1시간 이상(연간16시간)
- 교육책임자 : 안전보건총괄책임자
- 주관 : 당사 현장 안전관리자
- 교육내용 : 작업안전지도 요령
 - 기계,기구,설비류의 안전점검 요령
 - 관리자의 역할과 안전책임 임무관련 교육
 - 무재해 추진기법 도입에 의한 추진계획 수립방안
 - 유해물질관리, 직업병 유소견자 사후관리및 응급처치요령

라. 신규채용자 안전보건교육

- 대상 : 신규채용 근로자
- 장소 : 안전교육장
- 시간 : 신규채용자 발생 당일 작업착수전 1시간 이상
- 교육책임자 : 안전관리자, 관리감독자
- 주관 : 현장 안전관리자및 시공책임자
- 교육내용 : 공사현장 안내및 유해, 위험요소 위치설명
 - 각종 전원 단자함 위치및 사용자 안전수칙
 - 개인보호구 착용의 필요성및 위반시 현장조치 방안 설명

마. 수시교육(특별안전교육)

- 대상 : 유해, 위험장소내 또는 위험, 유해공종 작업자
- 장소 : 현장 또는 안전교육장
- 시간 : 해당작업 착수전 2시간 이상
- 교육책임자 : 안전관리자, 관리감독자, 안전담당자
- 주관 : 현장 안전관리자및 시공책임자
- 교육내용 : 해당작업의 위험도 인지훈련
 - 위험사태 발생시 대처방안및 사고대처 방법
 - 작업장내 안전수칙

바. 법정 직무교육

과정명(대상)	구분	교 육 시 간	교 육 대 상 (주기)	비 고
관리책임자	신규	6시간 이상	신규: 선임후 3개월 이내	
	보수	6시간 이상		
안전관리자	신규	34시간 이상	보수: 신규교육후 매 2년마다 (2년되기 전 3개월전부터)	
	보수	24시간 이상		

1-3-4. 주기별 안전교육내용

구 분	교 육 및 행 사	내 용	주 기
분기 계획	순 회 안 전 교 육	본사안전 전담요원이 전체 현장관리자 및 근로자 대상으로 O.H.P 교육 실시(중대재해사례)	분기별
	외부강사 위탁교육	분기별 안전강사 초빙 또는 위탁교육	분기별
월간 계 획	근로자정기교육	안전관리기법(태도 + 기능교육), 표준작업방법 및 근로자 준수사항	요일별
	관리감독자 정기교육	현장안전관리 개선 방법, 안전지도 및 사고조사 분석방법	요일별
	안전보건협의회	일일점검에 따른 문제점등의 토의와 조정	요일별
	안전공정회의	공구별 담당기사소집, 작업내용 및 공정진행시 예 측위험 발견 및 토의	요일별
	안전점검의 날	매월 4일 협력업체 책임자와 함께 점검	매월
주간 계 획	관리책임자교육	공종별 안전작업지침 및 안전대책	주간별
	중기 및 장비 점검일	자격자, 자체점검사항, 사용허가, 안전장치	주간별
	가설물 점검일	재료적재, 배수설비, 흙막이, 가설전기	주간별
	정리정돈 대청소	전 현장 정리정돈 및 현장내외 환경정리	주간별
	안전공정회의	공구별 작업내용 및 전 작업반장들의 안전작업 문제점 토의	주간별
일 일 계 획	신규채용자교육	안전보건법에 관한사항, 안전장치 및 보호구 사용 방법, 응급처치 및 대피요령, 기계기구 사용법	요일별
	작업내용변경시	해당 작업안전수칙 준수사항, 개인보호구 사용법	수시
	특별안전교육	목재가공용 기계기구 사용시, 아세틸렌용접장치 또는 가스집합 용접장치 사용법	수시
	임시안전교육	악차 사고 발생시 또는 긴급을 요구시(경각심)	수시
	교통재해 방지	운행계획, 장내운행방법, 유도원교육, 안전시설	수시
	건강진단	신규채용시, 정기, 특수검진의 실시	수시
	작업전 안전체조	전원 참가후 공종별집합 체조	매일

2. 안전 점검 계획

2-1. 안전관리계획(관련근거: 건설기술관리법 시행규칙 제21조의3 제1항)

1) 작성내용

- * 공사 개요 : 위치도,공사개요,공정표및 설계도서
- * 안전관리조직
- * 공정별 안전점검계획 : 자체안전점검,정기안전점검의 시기및 내용,실시계획및 결과에 대한
조치계획등
- * 공사장주변 안전관리계획 : 지하매설물의 방호,인접시설물의 보호등
- * 통행안전시설설치및 교통소통계획 : 공사장 주변의 교통소통대책,교통안전시설물,교통
사고예방대책등
- * 안전관리비 집행계획
- * 안전교육계획 : 교육계획표,교육종류및 내용,교육관리계획등
- * 비상시 긴급조치계획 : 비상연락망,비상동원계획,경보체계,응급조치및 복구등

2) 공종별 안전관리계획서 포함사항

① 단관비계

- * 재료 : 강관은 균열 뒤틀림의 변형이 없을것
- * 조립 : 각 부에는 깔판 깔목을 사용하고 밑 받침철물을 설치
비계 기둥의 간격은 보방향에서 1.5M ~ 1.8M 간 사이 방향 1.5M
띠장 간격은 1.5M이하 설치, 비계기둥의 적재하중은 400KG 초과금지

② 기계. 전기공사

- * 작업전 안전교육실시
- * 용접기 자동전격방지 장치 부착
- * 우천시 옥외 작업금지
- *용접 작업시 분말 소화기 비치

③ 낙하물 재해 방지대책

- * 안전보호구 착용 철저
- * 작업자의 팔래가 많은곳 낙하물 방지시설 설치
- * 상하동 작업시 상호간 긴밀 협조
- * 낙하물 투하금지
- * 자재운반시 지정된 통로사용
- * 작업시 하부에 인원 출입통제 금지
- * 현장 쓰레기 및 목재류 소각금지

④ 기타공사

- * 명일 공사계획에 대한 검토 필요시 안전교육 실시 및 안전시설, 안전대책 강구 후 작업시행

3) 제출시기및 방법

① 제출시기

- * 총괄안전관리계획서 : 실착공 16일전까지
- * 공종별 안전관리계획서 : 당해공종의 실착공 15일전까지

② 제출처 : 공사감독관

2-2. 현장안전 점검계획

2-2-1. 안전점검 유형

구 분		실 시 기 준
수시점검		수시 점검표에 의한 점검
정기점검	주간합동점검	매주 협력업체와 합동점검을 실시
	월간점검	매월 본사 환경안전팀에서 정기적으로 실시
	정기안전점검	외부 전문기관에 의뢰하여 실시 중대재해 발생시 특별점검 실시

2-2-2. 점검계획

구분	종 류	점검시기	점 검 자	점 검 대 상	주 요 점 검 내 용
수 시 점 검	일일점검	수시점검 (일일2회이상)	안전관리자	전 작업장	유해방지에 관한 사항 건설장비 유지 관리 상태 (안전 CHECK LIST)참조
			관리감독자	해당 공구	공종별 표준안전작업실시 여부 (표준 안전작업 방법 참조)
			안전담당자	해당작업반	주요 가설물의 불안전요소 이상유무 확인 (안전 CHECK LIST참조) 기타 안전사고예방조치 상태
정 기 점 검	주간안전 점검	주 1회 이상	안전총괄책임자	전 작업장	작업장 위험요소 안전조치상태 공종별 표준안전작업실시 여부 안전보호구 착용상태 건설장비등 각종기구의 안전상태 확 인 점검 기타 가시설의 불안전요소 유무확인
			안전관리자		
			책임자(협력 업체현장소장)		
			안전관리자		
기	월간점검	월간 1회	본사	전 작업장	유해, 위험에 대한 대책실시 여부 근로자, 관리감독자 등의 안전교육의 실시여부 점검
			안전관리팀		
점	월간점검	월간 1회	본사	전 작업장	표준안전관리비의 적정계상 및 사용 여부 점검 안전담당자, 안전관리자의 활동 상태 근로자 건강진단 실시여부 점검 추락, 낙하물 위험예방에 대한 안전 조치 준수여부 안전보건위원회 구성, 회의실시 여부
			안전관리팀		

구분	종 류	점검시기	점 검 자	점 검 대 상	주 요 점 검 내 용
특 별 점 검	특별점검	해빙기 우기 동절기 중대재해 발생시	외부기관및 본사 안전관리부		해빙기 : 지반 및 토사붕괴대비 우기 : 폭우,태풍,흑서대비 동절기 : 폭설,혹한 대비 중대재해 발생시 : 자체안전 진단 실시

2-2-3. 관리계획

종 류	지적사항 조치계획	비 고
일일점검	현장에서 사정조치	
주간합동점검	선 조치하고 부득이한 경우 안전보건 협의회를 실시후 대책을 강구한다	
월간점검	월간합동점검시와 동일하게 조치후 결과를 본사 안전 안전팀에 사진 첨부한 시정조치결과 보고서를 제출	
특별점검	본부 정기점검과 동일하게 조치한다	

2-2-4. 정기안전점검 실시계획

1) 관련근거 : 건설기술관리법시행령 제46조의 제2항

2) 시행대상

① 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제2조제2호및 3호에 의한 1종 시설물및 2종시설물

② 지하 10M이상의 굴착공사를 수반하는 공사로서

- 20M이내에 타 시설물이 있거나
- 100M안에 양육가축이 있어 영향받을 우려가 있는 공사

③ 품질보증계획 수립이 명시되어 있는 공사

3) 당 현장 적용 : ①에 의거 적용 - 전문기관에 의뢰 실시

산업안전보건관리비 사용계획서

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)포장 및 시설물 보수공사

2026. 04

주식회사 아산

산업안전보건관리비 사용계획서

건설업체명	㈜ 아 산	공 사 명	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
소 재 지	경기도 남양주시 호평동 외	대 표 자	진 익 주
공사금액	₩571,022,700	공사기간	2026. 04. 01 ~ 2026. 07. 29
발 주 자	의정부국토관리사무소	누계공정율	100.00%
계상된 안전관리비	₩12,397,587	공사진척도에 따른 사용 기준금액	(계상된 안전관리비 X 공정율)

사 용 금 액

항 목	사용계획 금액	비 고
1. 안전관리자등인건비및각종업무수당 등	-	
2. 안전시설비등	-	
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비등	12,880,000	
4. 안전진단비 등	-	
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	-	
6. 근로자 건강진단비 등	1,200,000	
7. 건설재해예방 기술지도비	-	
계	14,080,000	

건설업산업안전보건관리비계상 및 사용기준 제10조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용계획서를 작성하였습니다

2026 년 04 월 01 일

작 성 자 직 책 : 현 장 대 리 인

성 명 : 유 병 화 (서명 또는 인)

항목별 사용계획

항 목	사 용 내 역	수량	단가	금 액
1. 안전보건관계자인건비 및 각종업무수당 등				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
계				-
2. 안전시설비등				-
				-
				-
				-
				-
계				-
3. 개인 보호구 및 안전장구 구입비 등	안전화	30	80,000	2,400,000
	안전모	30	11,000	330,000
	안전조끼	30	15,000	450,000
	LED 안전조끼	30	200,000	6,000,000
	일회용방진마스크	50	20,000	1,000,000
	안전벨트 전체식	15	180,000	2,700,000
				-
계				12,880,000
4. 안전진단비등				-
				-
				-
계				-
5. 안전보건교육비 및 행사비 등				-
				-
				-
계				-
6. 근로자 건강진단비 등	혈압측정기	1	500,000	500,000
	음주측정기	1	500,000	500,000
	의료키트	1	200,000	200,000
				-
계				1,200,000
7. 건설재해 예방 기술 지도비				-
				-
				-
계				-
합 계				14,080,000

11. 환 경 관 리 계 획 서

환 경 관 리 계 획 서

국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

2026. 04

(주) 아 산

환경관리계획서

1. 환경관리 개요 및 계획

1.1. 목적

건설현장에서 발생하는 비산먼지, 소음, 폐기물 등의 환경오염에 관한 기준을 수립하여 환경피해를 최소화하고, 환경 관리 업무를 효율적으로 수행하여 쾌적한 생활환경과 작업환경을 확립하는데 있다.

1.2. 환경관리의 기본방향

가) 사전 공사계획 수립을 설계도서 및 시방서에 의거하여 철저한 관리 감독을 통한 환경 피해 발생 억제 및 최소화 할수 있도록 한다.

나) 여러 가지 교육을 통한 환경관리 조직을 강화하여 환경 피해 발생시 신속한 복구와 유사한 피해 재발을 방지하도록 한다.

다) 환경교육 및 점검계획

1) 환경교육

① 관리감독자교육 : 매월 공정회의시 교육 (월 1회)

② 교육방법 : 환경법규 규정 지침사항, 기타 환경관리에 관한 사항

③ 근로자 교육 : 현장안내, 환경규정 및 지침, 환경법규 규정 및 지침사항, 기타 환경관리에 관한사항

2) 점검계획 : 수시로

1.3. 용어의 정의

가) 생활환경 : 대기, 물, 폐기물, 소음, 진동, 악취등 사람의 일상생활과 관계되는 환경

나) 환경오염 : 사업활동 등 사람의 활동에 따라 발생하는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 방사능오염, 소음, 진동, 악취 등으로 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태

다) 대기오염물질 : 대기오염의 원인이 되는 가스, 입자상 물질 또는 악취물질

라) 수질오염 : 인간생활이나 생산 활동에 수반하여 오수가 흡입되거나 유역의 지질적 영향에 의해서 천연자연수의 수질이 화학적, 물리적, 생물학적으로 변화하는 현상

마) 소음 : 기계, 기구, 시설, 기타 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 소리

바) 진동 : 기계, 기구, 시설, 기타 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 흔들림

사) 악취 : 황화수소, 메르캅탄류, 아민류 등 자극성이 있는 기체상의 물질이 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새

1.4. 환경관리업무

가) 현장의 환경관리실적 관리

1) 폐기물 배출 관리대장

2) 환경관리 게시판

나) 고객만족의 대민활동 시행

- 1) 현장 주변 청소
- 2) 먼지발생 억제를 위한 주변 제도로 살수 작업
- 3) 현장주변 통행로에 휴지통 구비

다) 현장주변 민원 대폭 수렴 및 시행

- 1) 민원신고함 제작
- 2) 민원처리반 활용

라) 특정공사 사전신고

마) 비산먼지 발생신고

바) 폐기물 발생 배출신고

2. 건설 소음·진동 관리계획

2.1. 정의

소음이라 함은 기계, 기구, 시설 기타 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 소리를 말하며, 진동이라 함은 기계, 기구, 시설, 기타 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 흔들림을 말한다.

2.2. 소음과 진동이 인간에 미치는 영향

- 가) 인간의 신경계통에 불필요한 자극을 주기 때문에 호흡의 속도, 맥박, 혈압을 변화시킨다.
- 나) 침이나 꿀액의 분비, 위의 수축운동에 영향을 주어 소화기능을 약화시킨다.
- 다) 신진대사 기능이 증가하여 노화를 촉진시킨다.
- 라) 체질의 퇴행성 변화가 일어난다.
- 마) 작업 능률적인 관점에서 보면 작업의 속도, 정확도가 현저히 저하되고, 피로와 안전사고 발생이 증가 하게 된다.

2.3. 소음·진동 저감 방안

공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 사용 장비의 작업시간 조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다. 또한, 공사에 따른 추가적인 소음·진동 발생 시에는 제시하고 있는 기준에 적합하도록 별도의 대책을 수립하여야 하며, 소음·진동을 주기적으로 측정하여 민원에 대비하여야 할 것이다.

< 생활소음 규제기준의 범위 >

단위 : dB(A)

대상지역	대상소음		조석 (05:00 ~ 08:00) (18:00 ~ 22:00)	주간 (08:00 ~ 18:00)	심야 (22:00 ~ 05:00)
	시간별				
주거지역, 녹지지역, 취락지역 중 주거지역, 관 광휴양지역, 자연환경 보존지역, 학교병원의 부직경계선으로부터 50M 이내 지역	확성기에 의한 소음	옥외설치	70 이하	80 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 방사되는 경우	50 이하	55 이하	45 이하
	공장 및 사업장의 소음		50 이하	55 이하	45 이하
	공사장의 소음		65 이하	70 이하	55 이하
상업지역, 준공업지역, 일반공업지역, 취락지역 중 주거지구외의 지구	확성기에 의한 소음	옥외설치	70 이하	80 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 방사되는 경우	60 이하	65 이하	55 이하
	공장 및 사업장의 소음		60 이하	65 이하	55 이하
	공사장의 소음		75 이하	75 이하	55 이하

※ NOTE

- 1) 대상지역의 구분은 국토관리 이용법에 의하며, 도시지역은 도시계획법에 의한다.
- 2) 공사장 소음의 규제기준은 주간의 경우 소음발생시간이 1일 2시간 미만일때에는 +10dB, 2시간이상 4시간 이하 일때에는 +5dB를 보정한 값으로 한다.

< 지반조건에 따른 일반 주택의 피해정도와 진동속도와 관계(Langefors) >

지반조건	진동범위	지하수면 이하의 점토, 모래, 자갈	연약한 석회석 퇴석(MORaine) 슬레이트(SLATE)	사암, 편마암, 화 강암, 현무암 강 한 석회석, 석영질,	피해정도
종파의 전달속도(m/sec)		300~1,500	2,000~3,000	4,500~6,000	
진동속도 (cm/sec)	0.4 ~ 1.8		3.5 이하	7.0 이하	피해없음
	0.6 ~ 3.0		5.5	11.0	무시할수있는상태
	0.8 ~ 4.0		8.0	16.0	균열생성
	1.2 ~ 6.0		11.5 이하	23.0 이상	상당한 피해발생

< 국내에서 적용되는 진동허용치 >

단위 : cm/sec

구 분	문화재	주택/아파트	상가	철근콘크리트 빌딩 및 공장	COMPUTE 시설물 주변
건물기초에서의 허용진동치	0.2	0.5	1	1	0.2

2.3.1. 현지조사

건설공사의 설계, 시공에 있어서 현지의 정보를 수집하고 방음대책을 세우기 위해 행하는 것으로 조사의 순서에 따라 시공전의 조사, 시공시의 조사를 적시에 실시한다.

가) 시공전의 조사


시공전의 조사는 사용할 건설기계의 방음대책 내용에 대해서 검토하고 소음전파의 정도 등을 파악하는 예비지식을 가지고 행하는 것이다. 조사에 필요한 측정수, 조사의 범위는 건설공사의 규모, 내용 및 현장주변의 환경상황에 따라 설정한다.

- 1) 현장 주변의 상황 : 현장주변의 실태조사에서는 특히 건설작업과 수용측의 거리관계, 각종건물과의 위치 관계에 대해 정확히 파악해 놓을 필요가 있다.
- 2) 주변의 상황 : 주변건물의 종류, 사용목적, 밀집정도, 생활시간대 등에 대해 현지조사를 해놓을 것
- 3) 공공시설 : 유의해야 할 공공시설로는 학교, 병원, 도서관, 양로원 등을 들 수 있으며 이들 시설이 주변에 있는 경우는 시설을 이용하는 시간대를 조사해 놓을 것

나) 시공시의 조사

시공시의 조사 시공시의 설명한 시공전의 조사를 전제로 하여 현장주변의 조건, 입지조건 등과 대비하여 필요시 소음측정을 행하는 것으로 한다. 소음측정은 원칙적으로 KS A0701(소음도 측정 방법)에 준하여 실시한다.

3) 현장 소음, 진동 관리 흐름도

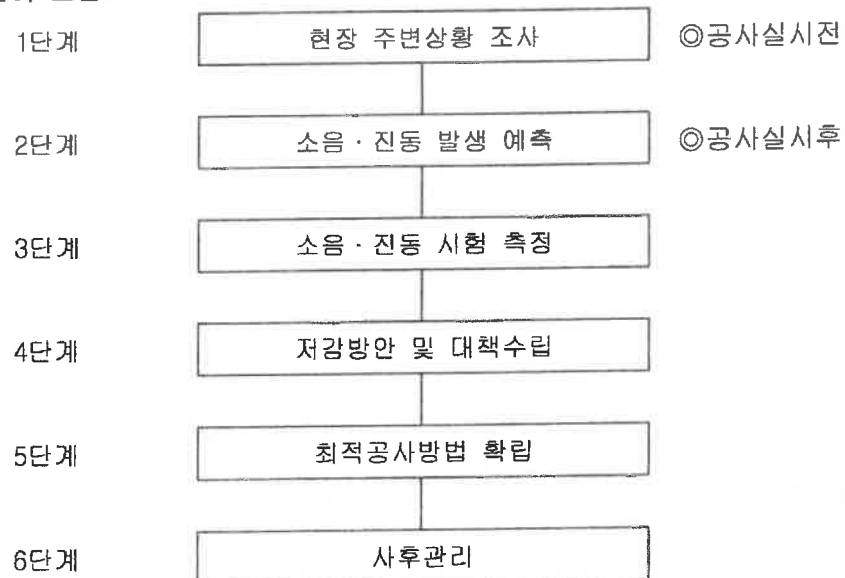

4) 현장의 소음·진동 저감방안

분 류	업 무 내 용
제 1단계 주민협력 체제 구축 및 현장 주변 상황조사	공사 시행전 지역주민에게 공사의 목적, 내용 등을 설명하여 협력을 구한다. .주변 주거환경에 따른 생활소음 규제대상 여부 확인 . 관할 관련 기관과 유대관계를 갖고 행정절차 등을 숙지한다
제 2단계 소음, 진 동발생 예측	건설소음, 진동 규제지역 여부 확인 .건설 소음, 진동의 특징을 고려하여 공사 .규제지역에서 특정공사를 할 경우 “특정공사 사전신고서” 제출 시행 전에 소음, 진동의 발생정도를 예측한다.
제 3단계 소음, 진 동측정(시험측정)	2단계에서 예측한 값이 소음, 진동 규제 기준을 상회하는 경우 - 관련부서에 통보하여 소음, 진동측정(시험측정)을 의뢰한다.
저감방안 및 대책 수립 제 4단계	- 관련부서에 통보하여 저감방안 및 대책 수립의 협조요청 3단계에서 실측한 값이 규제기준을 초과하는 경우

구체적인 소음, 진동 저감대책은 다음과 같다.

소음진동 종류	업 무 내 용
발전기 소음	- 방음형 발전기 설치 - 발전기 주위 방음판 별도 설치(방음벽: EGI 판넬)
컴프레서 소음	- 저소음형 컴프레서 설치 - 발전기 주위 방음판 별도 설치(방음벽: EGI 판넬)
기타 장비 소음	- 최대한 저소음 진동장비를 사용하고 이동속도의 제한으로 소음, 진동 등을 저감한다. - 계속 발생 시 방음벽을 설치한다.

4. 건설폐기물 처리 계획

4.1. 건설 폐기물처리계획

4.1.1. 정의

폐기물관리법에서 사용하는 “폐기물”이란 쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐알칼리 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 않은 물질을 말하며, 건설폐기물에는 건축공사에서 배출되는 폐기물로 토사, 콘크리트덩어리 아스팔트덩어리, 오니, 폐목재류, 종이류, 폐플라스틱 폐유리 및 도자기류 등이 있다.

4.2. 건설 폐기물의 종류 및 특성

4.2.1. 건설폐기물의 종류

가) 일반폐기물 - 폐목재류, 종이류, 섬유류, 태운재 및 기타 생활폐기물

나) 특정폐기물 - 오니, 폐유류, 폐플라스틱류, 금속조각, 유리 및 도자기류, 고무

4.2.2. 건설폐기물의 종류

가) 건설폐기물의 특성

- 1) 건설폐기물은 발생장소가 일정치 않으며, 배출량은 대량이다.
- 2) 폐기물의 종류가 다양하며 혼재된 상태로 배출되는 경우가 많다.
- 3) 공사가 활발한 봄, 가을철에 대량으로 발생된다.
- 4) 건설폐기물은 대부분 무기물로 구성되어 인체에 직접적인 피해는 적다.

4.3. 일반폐기물 처리방안

4.3.1. 일반폐기물 처리방안

가) 일반폐기물의 수집, 운반, 처리기준

1) 일반폐기물 수집, 운반

- ① 공사별, 계절별 발생량 및 특성을 고려하여 정기적으로 수집
- ② 공사여건에 맞게 기계식 상차방법에 의하여 수집, 운반
- ③ 수집, 운반 장비로부터 흩날리거나 흘러나오거나 악취가 분산되거나 오수가 흘러나오지 않게한다.
- ④ 다른 지역을 경유하는 경우 적재함이 밀폐된 차량으로 운반
- ⑤ 하역후 먼지가 발생하거나 흩날리지 않게 한다.
- ⑥ 수집, 운반장비는 항상 청결하게 유지한다.

나) 일반폐기물의 처리기준

- 1) 흩날리거나 흘러나오거나 악취가 분산되지 않도록 한다.
- 2) 쥐, 파리, 모기 등 해로운 벌레가 발생, 번식하지 않도록 약제의 살포
- 3) 매립
 - ① 일반폐기물 매립지라고 표시된 장소에만 매립한다. 다만, 1종류의 일반폐기물 또는 수질오염방지 조치가 필요하지 않은 2종류 이상의 일반폐기
 - ② 복토재는 15CM 두께의 1일 복토와 매립이 7일이상 중단되는 경우30CM이상의 중간복토를 매립지 사용완료후 50CM 이상의 최종복토를 한다.
 - ③ 특정폐기물이 아닌 부패성 폐기물만을 매립할 경우에는 일반폐기물의 높이가 매 3M되기 전에 복토한다.
 - ④ 침출수는 수질환경보전법 시행규칙의 오염물질 배출허용기준 이하로 처리한다.
 - ⑤ 일반폐기물 매립지에 직접 매립하기가 부적합한 오니 등의 일반폐기물을 매립하는 경우에는 환경처 장관이 정하여 고시하는 기준 및 방법에의하여 사전처리 후에 한다.
- 4) 소각
 - ① 소각시설에서 소각한다.
 - ② 소각시설로부터 악취, 먼지가 외부로 배출되지 않도록한다
 - ③ 소각은 폐기물을 고온산화시켜 가연성인 경우 80-90%까지 부피를 감소시킬수 있는 부패성물질을 안정화 시키는 방법임
 - ④ 소각시설을 설치 할 경우 폐기물 관리법에 의거 대기오염 및 수질오염을 방지할 수 있는 시설을 같이 설치하여야 소각할 수 있음

⑤ 소각시설이 없는 모든 현장은 폐기물별 전문처리업체에 의뢰하여 처리

5) 재활용

① 폐목재, 폐고철 등 재활용이 가능한 폐기류는 가능한 재사용하며 폐기물량을 줄이고 폐기물 자원화에 기여하여야함.

다) 건설현장의 폐기물처리 및 감량화 계획

- 1) 공사시 공사인부에 대한 계몽, 홍보를 통하여 공사폐기물의 불법적 투기를 금지하며, 가급적이며 폐석재, 폐콘크리트 등의 공사폐기물을 전량 수거하여 성토재료로 활용하는 등 폐건축자재를 재활용한다.
- 2) 기타 폐기물은 가연성과 불연성으로 분리수거한 후 행정기관과 협의하여 처리하도록 한다.
- 3) 공사시 발생하는 폐기물중 철재류, 목재류 등은 수거하여 재활용한다.
- 4) 상기외의 폐기물은 지정매립장으로 이송하여 적정처리한다.
- 5) 발생 폐기물은 가연성, 불연성, 재활용성 폐기물 등으로 분리수거하여 처리
- 6) 소각재 및 비가연성 물질은 지정 매립장에 매립처리한다.
- 7) 폐기물 발생량을 최소화하고 최대한 재활용한다.
- 8) 수거, 보관은 위생적이고 신속하게 처리한다.
- 9) 폐기물 관련 대장을 기록 보관한다.

환경보전비 사용계획서

공사명 : 국도46호선IC교(상)포장 및 시설물 보수공사

2026. 04

주식회사 아산

환경보전비 사용계획서

업 체 명	㈜아 산	공 사 명	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
소 재 지	경기도 남양주시 호평동 외	대 표 자	진 익 주
공 사 금 액	일금 오억칠천일백이만이천칠백 원정 (₩ 571,022,700)	공 사 기 간	2026. 04. 01 - 2026. 07.29
발 주 자	의정부국토관리사무소	누계공정율	100.00%
계상된 환경보전비	일금 이백구십만사천팔백육십이 원정 (₩ 2,904,862)	공사진척도에 따른 사용기준금액	(계상된 환경보전비 X 공정율)


사 용 금 액

항 목	전월까지 누계	금월사용액	누계사용금액
계	-	3,000,000	3,000,000
1. 현장주변 청소 및 정리정돈 비용		-	-
2. 환경보존 시설비		3,000,000	
3. 오수, 탁수 처리시설		-	
4. 세륜시설 및 먼지방지 시설		-	
5. 토사유출 방지 시설		-	
6. 환경자료 및 홍보물 구입비용		-	
7. 환경기술인 환경관련 인건비		-	

건설업 환경보전비 계상 및 사용기준 제 26조 제5항의 규정에 의하여 위와 같이 사용계획서를 작성하였습니다.

2026년 04월 01일

작 성 자 직 책 : 현 장 대 리 인

성 명 : 유 병 화 (서명  는 인)

항 목 별 사 용 내 역


항 목	사용내역	금 액	비 고
1. 현장주변 청소 및 정리정돈 비용			
	소 계	0	
2. 환경보존 시설비	이동식 화장실 임대	3,000,000	
	소 계	3,000,000	
3. 오수, 탁수 처리시설			
	소 계	0	
4. 세륜시설 및 먼지 방지 시설			
	소 계	0	
5. 토사유출 방지 시설			
	소 계	0	
6. 환경자료 및 홍보물 구입 비용			
	소 계	0	
7. 환경기술인 및 환경관리 인건비			
	소 계	0	
합 계		3,000,000	

12. 교 통 처 리 계 획 서

[illegible]

km 선방 1차로 공사중

3차로 중 2차로 차단

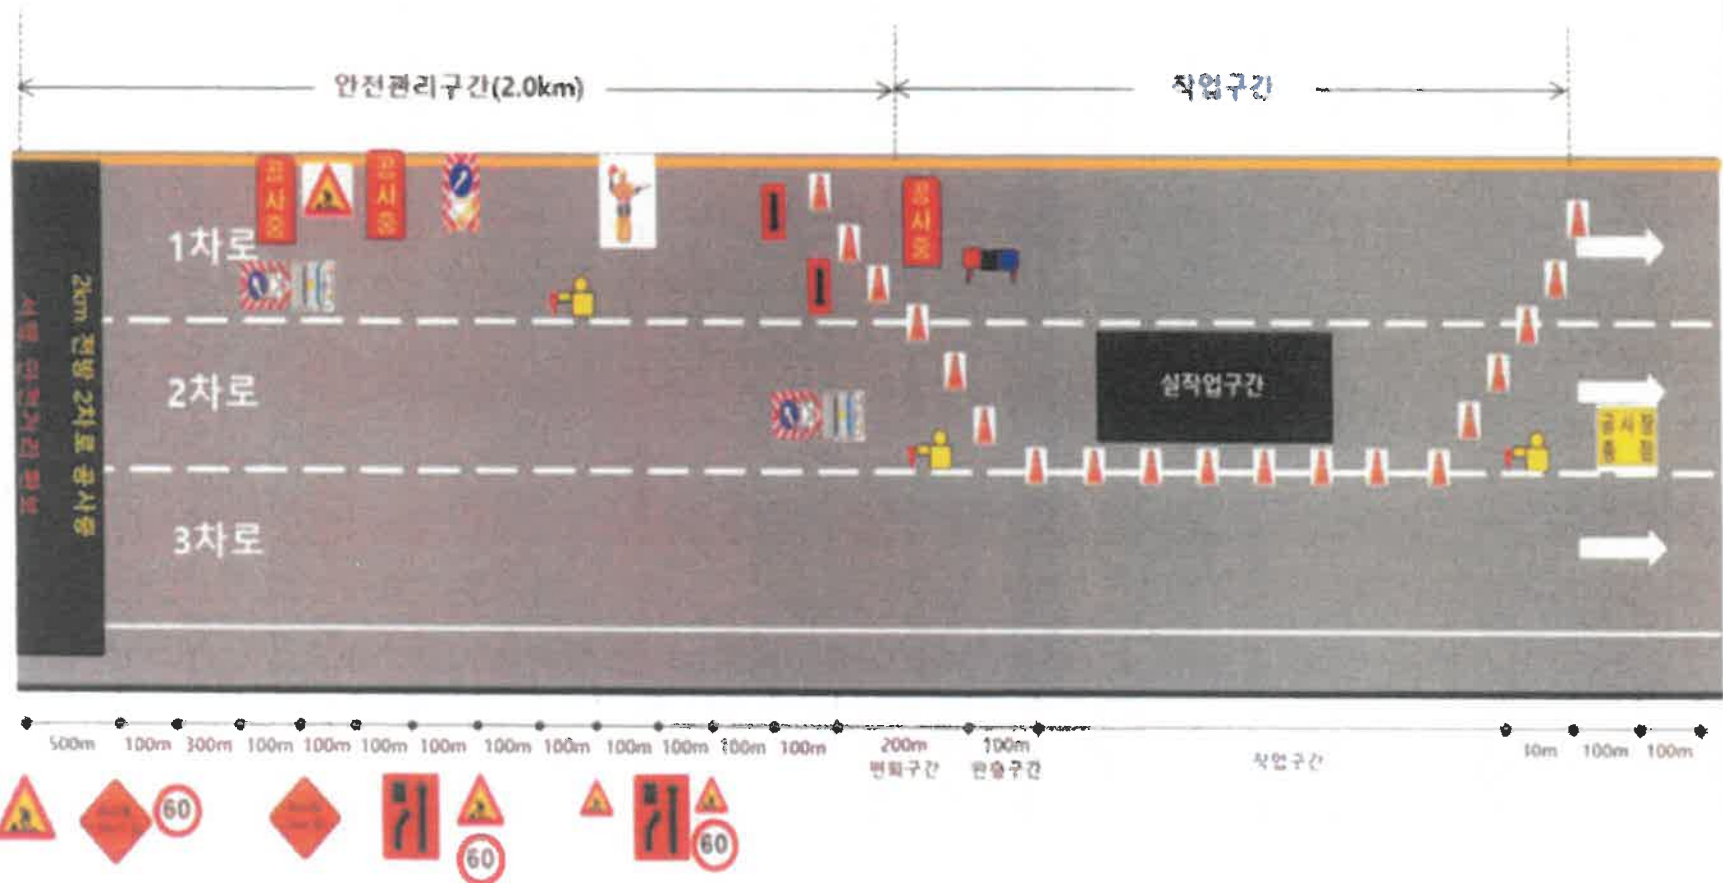

[illegible]

안전관리구간(2.0km)

작업구간

1차로

2차로

3차로

실착업구간

500r

100m

00m

10

1.00mm

2009

10

100

CaOx

10

100

100


변화구간 완충구간

작업구간

100

100m

〈예시도 3〉 4차로도로 일방향 통제공사

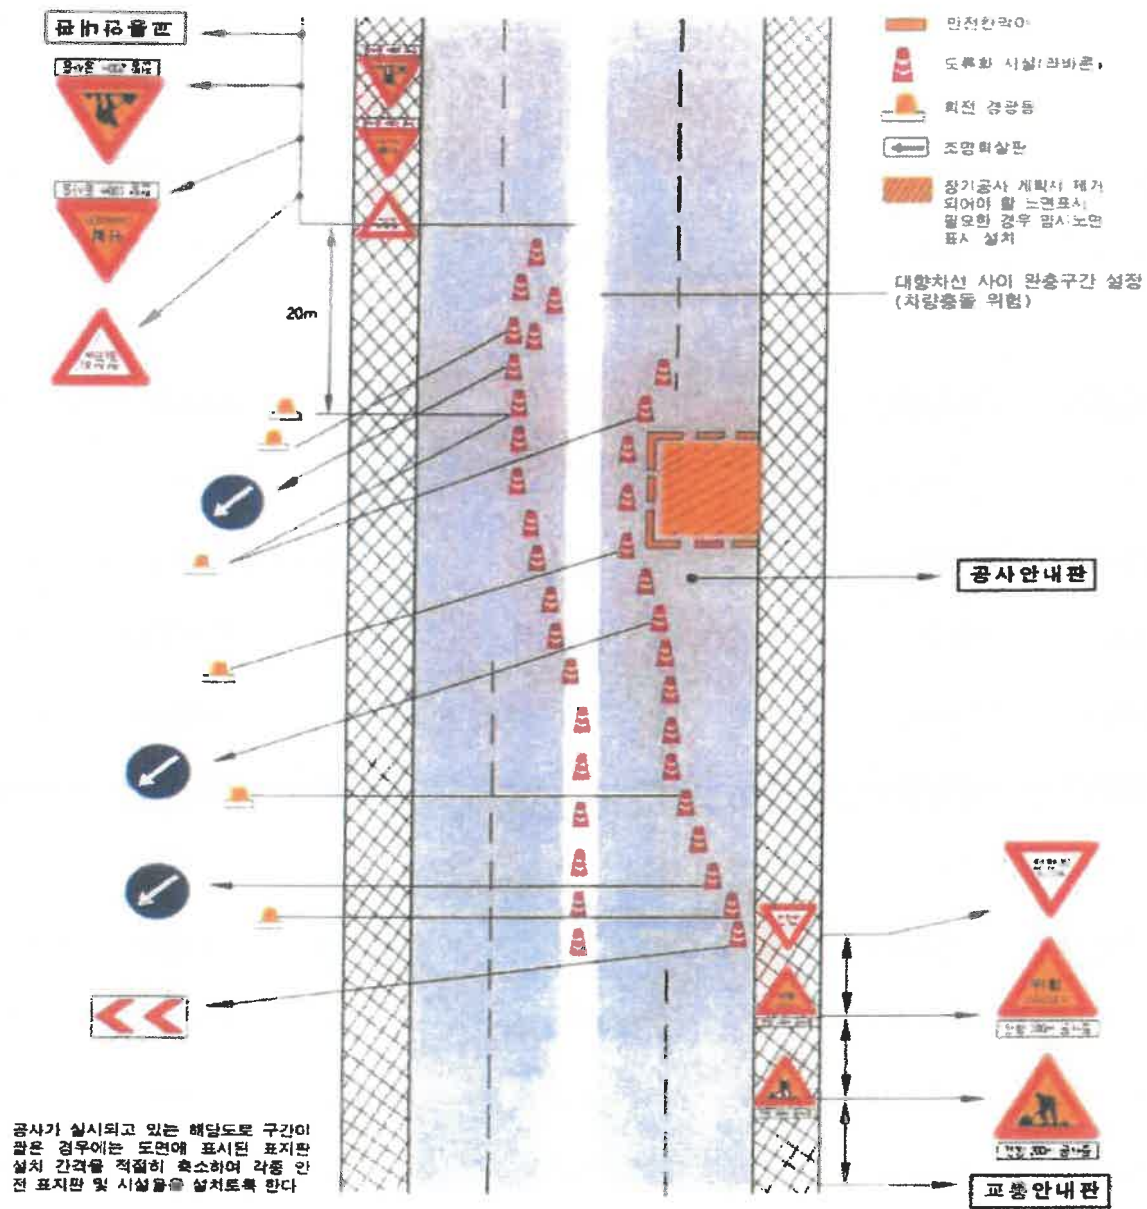

13. 직 접 시 공 계 획 서

건설공사의 직접시공계획서

(앞쪽)

공 사 명	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사				
①공 종	공종:토목 세부공종:도로교량		현장소재지 경기도 남양주시 호평동IC 외		
발 주 자	상호(기관명) 의정부국토관리사무소	구분 [✓] 공공기관 [] 민간	대표자 의정부국토관리사무소장		
	주소 경기도 의정부시 송산로 1153				
수 급 인	상 호 주식회사 아산		대 표 자 진 익 주		
	영업소 소재지 경기도 남양주시 다산중앙로146번길70-123(다산동), 2층				
도급방법	[✓] 단독도급 [] 공동도급([] 공동이행방식 [] 분담이행방식 [] 주계약자관리방식)				
계약성질	[] 장기계속공사 [✓] 기타공사				
②계약일	2026년 03월 27일	③착공일	2026년 04월 01일	④준공예정일	2026년 07월 29일
⑤총 노무비	(일금이억일천팔백사십삼만오천일백팔십칠원정 ₩218,435,187원)				

직접시공계획

직접시공 공종(기능인력 투입예정 인원 :620명)		하도급(예정) 공종	
⑥세부공종	금액	⑥세부공종	금액
호평IC교	9,456,706	호평IC교	100,828,552
신구운교 등	19,065,509	신구운교 등	58,144,972
간접노무비	4,706,568	간접노무비	26,232,880
⑦직접시공 금액 합계 (직접시공 노무비)	33,228,783	⑧하도급(예정) 총 노무비	185,206,404

「건설산업기본법」 제28조의2에 따라 건설공사의 직접시공계획을 통보합니다.

2026년 04월 일

수급인 주식회사 아산 대표이사 진 익 주 (서명 또는 인)

경기도산림환경연구소장 귀하

구비서류	1. 직접 시공 및 하도급 할 공사량·공사단가 및 공사금액(노무비 포함)이 분명하게 적힌 공사내역서 2. 예정공정표
------	---

직접시공내역서

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

구분	금액	
계약노무비금액	일금 이억일천팔백사십삼만오천일백팔십칠원정	(₩ 218,435,187)
직접시공노무비금액	일금 삼천삼백이십이만팔천칠백팔십삼원정	(₩ 33,228,783)
하도급노무비금액	일금 일억팔천오백이십만육천사백사원정	(₩ 185,206,404)

직접시공비율 : 15.21%

2026년 04월 01일

하도급시공비율 : 84.79%

주소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층

회사명 : 주식회사 아산

대표자 : 진익주 (인)



총괄내역서(직접시공 분할)

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사

공종	품 명	규 격	단위	계약노무비		직접시공 노무비		하도급 노무비		비 고
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	
1.	국도46호선 호평IC교(상)				110,285,258		9,456,706		100,828,552	8.57%
2.	국도46호선 신구운교 등				77,210,481		19,065,509		58,144,972	24.69%
	순 공 사 비				187,495,739		28,522,215		158,973,524	15.21%
	간접노무비		식	1	30,939,448	1	4,706,568		26,232,880	15.21%
	산재보험료		식	1		1				
	고용보험료		식	1		1				
	건강보험료		식	1		1				
	연금보험료		식	1		1				
	노인장기요양보험료		식	1		1				
	퇴직공제부금비		식	1		1				
	건설기계대여금지급보증서발급액		식	1		1				
	산업안전보건관리비		식	1		1				
	환경보전비		식	1		1				
	하도급대금지급보증수수료		식	1		1				
	기타경비		식	1		1				
	순공사원가		식	1	218,435,187	1	33,228,783		185,206,404	15.21%
	일반관리비		식	1		1				
	이윤		식	1		1				
	안전관리계획서 작성									
	폐기물처리비									
	총원가				218,435,187		33,228,783		185,206,404	15.21%
	부가가치세		%							
	도급예정액				218,435,187		33,228,783		185,206,404	15.21%

내역서 (직접시공 분할)

공종	품명	규격	도급금액				직접시공 노무비			하도급노무비			비고
			수량	단위	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
1.	국도46호선 호평IC교(상)					110,285,258			9,456,706			100,828,552	8.57%
1-1	호평 IC교 (상)					110,285,258			9,456,706			100,828,552	8.57%
1-1-1	아스팔트 포장 결삭 후 덧씌우기					108,354,908			7,526,356			100,828,552	6.95%
	아스팔트 포장 결삭후 아스팔트 덧씌우기	A-Type (1회결삭,2회포장)-야간작업	1,969	m²	3,674	7,234,106	1,969	3,674	7,234,106		3,674		100.00%
	교면방수	JJ 시트식 복합 교면방수 (야간)	1,969	m²	51,208	100,828,552		51,208		1,969	51,208	100,828,552	
	교면돌배기 유공관	Φ 15mm, 그물망형, 야간	125	M	2,338	292,250	125	2,338	292,250		2,338		100.00%
	아스팔트유제	RSC-4	4	D/M			4						
1-1-3	부대공					1,930,350			1,930,350				100.00%
	차선도색(옹작식, 일반형)-운행도로, 차량부분통	수동식, 백색실선	65	m²	2,886	187,590	65	2,886	187,590		2,886		100.00%
	차선도색(옹작식, 일반형)-운행도로, 차량부분통	수동식, 백색파선	5	m²	5,773	28,865	5	5,773	28,865		5,773		100.00%
	차선도색(옹작식, 일반형)-운행도로, 차량부분통	수동식, 문자, 기호	72	m²	16,039	1,154,808	72	16,039	1,154,808		16,039		100.00%
	교통안전관리비	야간	1	일	501,653	501,653	1	501,653	501,653		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	중기운반	아스콘포장	1	식			1						
	품질시험비	연성포장	1	식			1						
2.	국도46호선 신구운교 등					77,210,481			19,065,509			58,144,972	24.69%
2-1	신구운교(춘천)					2,999,433			1,387,064			1,612,369	46.24%
2-1-1	보수공					1,703,281			90,912			1,612,369	5.34%
	방호벽 및 증분대					279,280						279,280	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	2	m²	139,640	279,280		139,640		2	139,640	279,280	
	바닥판 하면					791,502			90,912			700,590	11.49%
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	10	m²	70,059	700,590		70,059		10	70,059	700,590	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	3	m	30,304	90,912	3	30,304	90,912		30,304		100.00%
	교대					57,403						57,403	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	1	m²	57,403	57,403		57,403		1	57,403	57,403	
	교각					575,096						575,096	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	8	m²	57,403	459,224		57,403		8	57,403	459,224	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
2-1-2	부대공					1,296,152			1,296,152				100.00%
	굴절차	22M (야간)	1	일	734,763	734,763	1	734,763	734,763		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	1	일	501,653	501,653	1	501,653	501,653		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7m²	1	m²	2,302	2,302	1	2,302	2,302		2,302		100.00%
2-2	조종교					13,034,608			2,987,128			10,047,480	22.92%
2-2-1	보수공					10,502,040			454,560			10,047,480	4.33%
	바닥판 하면					7,320,758						7,320,758	

내역서 (직접시공 분할)

공종	품명	규격	도급금액				직접시공 노무비			하도급노무비			비고
			수량	단위	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	84	㎡	70,059	5,884,956		70,059		84	70,059	5,884,956	
	단면보수(SSR공법)	천정T=10mm (야간)	10	㎡	82,371	823,710		82,371		10	82,371	823,710	
	철근방청 단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	4	㎡	153,023	612,092		153,023		4	153,023	612,092	
	교대					1,585,580			363,648			1,221,932	22.93%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	14	㎡	57,403	803,642		57,403		14	57,403	803,642	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=10mm (야간)	6	㎡	69,715	418,290		69,715		6	69,715	418,290	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	12	m	30,304	363,648	12	30,304	363,648		30,304		100.00%
	교각					1,595,702			90,912			1,504,790	5.70%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	25	㎡	57,403	1,435,075		57,403		25	57,403	1,435,075	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=10mm (야간)	1	㎡	69,715	69,715		69,715		1	69,715	69,715	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	3	m	30,304	90,912	3	30,304	90,912		30,304		100.00%
2-2-2	부대공					2,532,568			2,532,568				100.00%
	굴절차	22M (야간)	2	일	734,763	1,469,526	2	734,763	1,469,526		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	2	일	501,653	1,003,306	2	501,653	1,003,306		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7㎡	1	㎡	2,302	2,302	1	2,302	2,302		2,302		100.00%
2-3	사능1교(상)					24,351,330			4,909,323			19,442,007	20.16%
2-3-1	보수공					20,078,391			636,384			19,442,007	3.17%
	방호벽 및 중분대					5,976,182			90,912			5,885,270	1.52%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	90	㎡	57,403	5,166,270		57,403		90	57,403	5,166,270	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	5	㎡	115,872	579,360		115,872		5	115,872	579,360	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	139,640	139,640		139,640		1	139,640	139,640	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	3	m	30,304	90,912	3	30,304	90,912		30,304		100.00%
	바닥판 하면					6,199,699			30,304			6,169,395	0.49%
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	38	㎡	70,059	2,662,242		70,059		38	70,059	2,662,242	
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	13	㎡	128,529	1,670,877		128,529		13	128,529	1,670,877	
	철근방청 단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	12	㎡	153,023	1,836,276		153,023		12	153,023	1,836,276	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	1	m	30,304	30,304	1	30,304	30,304		30,304		100.00%
	교대					3,228,454			242,432			2,986,022	7.51%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	50	㎡	57,403	2,870,150		57,403		50	57,403	2,870,150	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	㎡	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	8	m	30,304	242,432	8	30,304	242,432		30,304		100.00%
	교각					4,674,056			272,736			4,401,320	5.84%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	48	㎡	57,403	2,755,344		57,403		48	57,403	2,755,344	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	13	㎡	115,872	1,506,336		115,872		13	115,872	1,506,336	
	철근방청 단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	139,640	139,640		139,640		1	139,640	139,640	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	9	m	30,304	272,736	9	30,304	272,736		30,304		100.00%
2-3-2	부대공					4,272,939			4,272,939				100.00%

내역서 (직접시공 분할)

공종	품명	규격	도급금액			직접시공 노무비			하도급노무비			비고	
			수량	단위	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가		금액
	굴절차	22M (야간)	3	일	734,763	2,204,289	3	734,763	2,204,289		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	4	일	501,653	2,006,612	4	501,653	2,006,612		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7㎡	2	㎡	2,302	4,604	2	2,302	4,604		2,302		100.00%
	품질시험비	압축강도, 부착강도	1	식			1						
2-4	사능1교(하)					12,815,681			3,306,957			9,508,724	25.80%
2-4-1	보수공					9,781,460			272,736			9,508,724	2.79%
	방호벽 및 증분대					3,494,612			121,216			3,373,396	3.47%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	20	㎡	57,403	1,148,060		57,403		20	57,403	1,148,060	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	18	㎡	115,872	2,085,696		115,872		18	115,872	2,085,696	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	139,640	139,640		139,640		1	139,640	139,640	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	4	m	30,304	121,216	4	30,304	121,216		30,304		100.00%
	바닥판 하면					3,378,925			60,608			3,318,317	1.79%
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	25	㎡	70,059	1,751,475		70,059		25	70,059	1,751,475	
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	11	㎡	128,529	1,413,819		128,529		11	128,529	1,413,819	
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	1	㎡	153,023	153,023		153,023		1	153,023	153,023	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	2	m	30,304	60,608	2	30,304	60,608		30,304		100.00%
	교대					1,007,221			30,304			976,917	3.01%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	15	㎡	57,403	861,045		57,403		15	57,403	861,045	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	㎡	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	1	m	30,304	30,304	1	30,304	30,304		30,304		100.00%
	교각					1,900,702			60,608			1,840,094	3.19%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	26	㎡	57,403	1,492,478		57,403		26	57,403	1,492,478	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	3	㎡	115,872	347,616		115,872		3	115,872	347,616	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	2	m	30,304	60,608	2	30,304	60,608		30,304		100.00%
2-4-2	부대공					3,034,221			3,034,221				100.00%
	굴절차	22M (야간)	2	일	734,763	1,469,526	2	734,763	1,469,526		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	3	일	501,653	1,504,959	3	501,653	1,504,959		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7㎡	1	㎡	2,302	2,302	1	2,302	2,302		2,302		100.00%
2-5	적성교					3,852,197			1,508,280			2,343,917	39.15%
2-5-1	보수공					2,556,045			212,128			2,343,917	8.30%
	방호벽 및 증분대					370,318						370,318	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	2	㎡	57,403	114,806		57,403		2	57,403	114,806	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	㎡	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	139,640	139,640		139,640		1	139,640	139,640	
	바닥판 하면					1,167,825						1,167,825	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	13	㎡	70,059	910,767		70,059		13	70,059	910,767	

내역서 (직접시공 분할)

공종	품명	규격	도급금액				직접시공 노무비			하도급노무비			비고
			수량	단위	단가	금액	수량	단가	금액	수량	단가	금액	
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	2	m²	128,529	257,058		128,529		2	128,529	257,058	
	교대					345,484						345,484	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	4	m²	57,403	229,612		57,403		4	57,403	229,612	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	교각					672,418			212,128			460,290	31.55%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	6	m²	57,403	344,418		57,403		6	57,403	344,418	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	7	m	30,304	212,128	7	30,304	212,128		30,304		100.00%
2-5-2	부대공					1,296,152			1,296,152				100.00%
	굴절차	22M (야간)	1	일	734,763	734,763	1	734,763	734,763		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	1	일	501,653	501,653	1	501,653	501,653		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7m³	1	m³	2,302	2,302	1	2,302	2,302		2,302		100.00%
2-6	호평IC교(상)					9,186,294			1,919,021			7,267,273	20.89%
2-6-1	보수공					7,388,489			121,216			7,267,273	1.64%
	방호벽 및 중분대					3,383,010			121,216			3,261,794	3.58%
	표면보수(SSR공법)	벽체	18	m²	38,269	688,842		38,269		18	38,269	688,842	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	21	m²	115,872	2,433,312		115,872		21	115,872	2,433,312	
	철근방청단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	m²	139,640	139,640		139,640		1	139,640	139,640	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	4	m	30,304	121,216	4	30,304	121,216		30,304		100.00%
	바닥판 하면					1,765,696						1,765,696	
	표면보수(SSR공법)	천정 (야간)	19	m²	70,059	1,331,121		70,059		19	70,059	1,331,121	
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	1	m²	128,529	128,529		128,529		1	128,529	128,529	
	철근방청단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	2	m²	153,023	306,046		153,023		2	153,023	306,046	
	교대					1,952,768						1,952,768	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	32	m²	57,403	1,836,896		57,403		32	57,403	1,836,896	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	m²	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	교각					287,015						287,015	
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	5	m²	57,403	287,015		57,403		5	57,403	287,015	
2-6-2	부대공					1,797,805			1,797,805				100.00%
	굴절차	22M (야간)	1	일	734,763	734,763	1	734,763	734,763		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	2	일	501,653	1,003,306	2	501,653	1,003,306		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7m³	1	m³	2,302	2,302	1	2,302	2,302		2,302		100.00%

내역서 (직접시공 분할)

공종	종 명	규 격	도 급 금 액				직접시공 노무비			하도급노무비			비 고
			수 량	단 위	단 가	금 액	수량	단 가	금 액	수량	단 가	금 액	
2-7	호평IC교(하)					10,970,938			3,047,736			7,923,202	27.78%
2-7-1	보수공					8,438,370			515,168			7,923,202	6.11%
	방호벽 및 중분대					2,252,470			272,736			1,979,734	12.11%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	26	㎡	57,403	1,492,478		57,403		26	57,403	1,492,478	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	3	㎡	115,872	347,616		115,872		3	115,872	347,616	
	철근방청 단면보수(SSR공법)	벽체T=50mm (야간)	1	㎡	139,640	139,640		139,640		1	139,640	139,640	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	9	m	30,304	272,736	9	30,304	272,736		30,304		100.00%
	바닥판 하면					948,341						948,341	
	표면보수(SSR공법)	천정	11	㎡	46,706	513,766		46,706		11	46,706	513,766	
	단면보수(SSR공법)	천정T=30mm (야간)	1	㎡	128,529	128,529		128,529		1	128,529	128,529	
	철근방청 단면보수(SSR공법)	천정T=50mm (야간)	2	㎡	153,023	306,046		153,023		2	153,023	306,046	
	교대					2,728,245			30,304			2,697,941	1.11%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	47	㎡	57,403	2,697,941		57,403		47	57,403	2,697,941	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	1	m	30,304	30,304	1	30,304	30,304		30,304		100.00%
	교각					2,509,314			212,128			2,297,186	8.45%
	표면보수(SSR공법)	벽체 (야간)	38	㎡	57,403	2,181,314		57,403		38	57,403	2,181,314	
	단면보수(SSR공법)	벽체T=30mm (야간)	1	㎡	115,872	115,872		115,872		1	115,872	115,872	
	콘크리트 균열보수(야간)	주입공법	7	m	30,304	212,128	7	30,304	212,128		30,304		100.00%
2-7-2	부대공					2,532,568			2,532,568				100.00%
	굴절차	22M (야간)	2	일	734,763	1,469,526	2	734,763	1,469,526		734,763		100.00%
	교통안전관리비	야간	2	일	501,653	1,003,306	2	501,653	1,003,306		501,653		100.00%
	로봇신호수 설치 및 철거	야간	1	조	57,434	57,434	1	57,434	57,434		57,434		100.00%
	폐기물상차	백호0.7㎡	1	㎡	2,302	2,302	1	2,302	2,302		2,302		100.00%
	순 공 사 비					187,495,739			28,522,215			158,973,524	15.21%

예 정 공 정 표

공사명 : 국도46호선 호평IC교(상)등 포장 및 시설물보수공사

공 종		보 할	착수 20 일	착수 40 일	착수 60 일	착수 80 일	착수 100 일	착수 120 일	비 고
1. 국도46호선 호평IC교(상)		63.4%	자재 및 현장준비		15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	
2. 국도46호선 신구운교등		36.6%	자재 및 현장준비		9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	
소 계	소 계	100.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	
누 계	누 계		0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층

상 호 : 주식회사 아 산

대 표 자 : 진 익 주 (인)



14. 노 무 비 세 부 사 항 합 의 서

노무비 세부사항 합의서	
공 사 명	국도46호선 호평ic교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
총공사 부가금액	일금 오억칠천일백이만이천칠백원정(W 571,022,700.-)
당해연도 계약금액	일금 오억칠천일백이만이천칠백원정(W 571,022,700.-)
총 공사기간	2026.04.01. ~ 2026.07.29
당해연도 공사기간	2026.04.01. ~ 2026.07.29
위 시설공사의 「노무비 구분관리 및 지급확인제」 운영을 위하여 의정부국도관리사무소와 계약상대자는 다음 사항에 대하여 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.	
제1조(근거) 본 합의서는 계약예규 공사계약일반조건 제43조의 3(노무비의 구분관리 및 지급확인)의 규정에 근거한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’(이하 ‘노무비 구분관리제’라 합니다.) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다. 제2조(정의) ‘노무비 구분관리제’란 발주자, 수급인 및 하수급인이 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주자가 수급인에게 또는 수급인이 하수급인에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다. 제3조(대상공사 및 지급범위) 2012년 1월 1일 이후 도급계약 체결하는 공공공사(장기계속공사, ‘12년도 계속비 전환사업 포함)를 대상으로 모든 근로자(직접 노무비 대상에 한함, 자재·장비 대금 제외)에게 지급합니다. 제4조(업무처리절차) 회계예규, 국토해양부 지침 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 국가계약법 등에 따라 양 당사자간의 합의에 따라 정합니다. 제5조(노무비 전용통장) 수급인은 노무비 전용통장 개설은 공동도급사간의 합의에 의해 대표사 명의로 개설함을 원칙으로 하나, 부득이한 사유가 발생할 시에는 발주자의 승인을 얻어 대표사 이외 도급사 명의로 통장을 개설할 수 있습니다. 전용통장의 변경도 발주자의 승인을 받아야 합니다. 제6조(선금지급) 선급금에서 노무비는 제외되므로 선급금 신청금액은 발주자와 협의하여 신청하도록 합니다. 제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 도급액을 초과한 노무비에 대해서는 수급인이 지급하여야 합니다.	

붙임 2. 노무비 세부사항 합의서(수급인용)

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우 또는 계약상대자가 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우에는 발주기관의 승인을 받아 그러하지 아니할 수 있습니다.

제9조(성실의무) 수급인은 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주자는 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 수급자는 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주자와 수급자가 협의하여 정할 수 있습니다.

2026년 03월 27일

계약자	상 호	㈜ 아 산	사업자등록번호	132-81-13913
	주 소	경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123	전 화 번 호	031-564-9407
	대표자	진 익 주	F A X	031-564-9403
계약자	상 호		사업자등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	관리인		F A X	
계약자	상 호		사업자등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대표자		F A X	
연대보증인	상 호		사업자등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대표자		F A X	

의정부국도관리사무소 교통시설특별회계 재무관

청렴계약 이행서약서

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 국토교통부 및 소속기관에서 발주하는 모든 공사·설계·감리용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
- 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 국토교통부 및 소속기관에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.
- 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰 가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참여하지 않겠습니다.
- 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않습니다.

○ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공하는 등의 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않습니다.

○ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않습니다.

○ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않습니다.

3. 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 부정한 청탁에 의한 재물 또는 재산상의 이익을 제공하지 않습니다.

○ 이를 위반하여 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 부정한 청탁에 의한 재물 또는 재산상의 이익을 제공하여 2개월 내지 8개월의 영업정지처분을 받을 경우에는 국토교통부 및 소속기관이 시행하는 입찰에 영업정지처분을 받은 날부터 4개월 내지 1년 4개월 동안 참여하지 않습니다.

4. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우 및 국가계약법시행령 제4조의2제1항각호의 사항에 해당하는 경우에는 ‘부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분’을 받겠으며, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 발주기관에서 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
5. 회사 임·직원이 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
6. 본 건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 국토교통부 및 소속기관 등에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협조하겠습니다.
7. 본 건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하수급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 국토교통부 및 소속기관의 조치와 관련하여 당사가 국토교통부 및 소속기관을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026. 03. 27.

서 약 자

상 호 : (주) 아산 대표이사 전 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하

「하도급지킴이(공사대금관리시스템)」 이용 확약서

당 사는 동 확약서 제출일자 이후 본 공사에 대한 하도급계약 체결(기 체결된 하도급계약 포함) 및 대금지급 등 이행에 있어 계약상대자이자 원수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 확약합니다.

- 당 사는 노무비, 하도급 대금, 장비·자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하며 또한 발주기관과 상호 협의하여 결정한 바에 따르겠습니다.
- 노무비, 하도급대금, 장비·자재대금 등의 지급에 있어 “인출 제한” 기능을 사용하겠습니다.
- 발주기관의 노무비, 하도급대금, 장비·자재 대금의 직접 지급 또는 적정 지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.
- 또한 노무비, 하도급 대금, 장비·자재 대금이 하도급지킴이를 통하여 지급될 수 있도록 발주기관의 요구사항에 적극 협력하겠습니다.
- 당 사는 「하도급지킴이*」를 이용(‘표준하도급계약서’에 기반)하여 하도급 계약을 체결하겠습니다. 아울러, 하도급자(자재·장비업체 포함)와 수기로 하도급계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.
- 기타 세부사항은 조달청에서 운영중인 정부계약 하도급지킴이시스템 [나라장터-하도급지킴이-시스템 사용안내(업체)] 절차를 준수하겠습니다.

2026. 03. 27.

서약자 : 국토46호선호평ic현장 계약상대자 (주) 아산 대표 진익주 (인)



의정부국토관리사무소 귀하

통장사본 출력

NH Bank

NH Bank

튼튼한 민족은행 - 농협!

계좌번호 317-0007-5974-51
예금종류 하도급관리계좌(하도급지킴이)

(주)아산  고정계좌



가입하신 날 : 2014/06/09
계좌관리 점포 : 남양주시지부(T:031-563-5991)
통장발행 점포 : 인터넷뱅킹

 NH농협은행

인터넷통장사본 발행일 : 2020년 07월 30일

전자금융 이용안내

▶ 인터넷뱅킹

- banking.nonghyup.com
- 각종조회, 이체, 예·적금/편도신규, 대출실행

▶ 텔레뱅킹

- 전국 어디서나 **1588-2100**
지역번호 없이 **1544-2100**
- 해외에서 이용시 **82-2-3704-1004**

안내 말씀

▶저희 농협은행을 이용하여 주셔서 감사합니다.

1. 이 통장의 거래에는 저희 은행의 예금거래기본약관 및 해당 예금약관이 적용되며, 약관은 언제나 저희 영업점 또는 인터넷홈페이지(banking.nonghyup.com)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 통장, 도장 등을 분실하거나 주소, 연락처 등이 바뀌면 바로 가까운 영업점 또는 콜센터(1588-2100, 1544-2100)로 알려 주십시오.
3. 통장, 도장은 따로 보관하시는 것이 안전하며, 비밀 번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주시기 바랍니다.

농협 인터넷뱅킹에서 제공해드린 통장사본입니다.

본 사본은 고객보관용으로 어떠한 용도의 증빙서로도 사용하지 않습니다.

원본대조필



- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

통장사본 출력

NH Bank

NH Bank

튼튼한 민족은행 - 농협!

계좌번호 317-0007-5972-81

예금종류 하도급관리계좌(하도급지킴이)

(주)아산 **님** 선금계좌



가입하신 날 : 2014/06/09

계좌관리 점포 : 남양주시지부(T:031-563-5991)

통장발행 점포 : 인터넷뱅킹

NH 농협은행

인터넷통장사본 발행일 : 2020년 07월 30일

전자금융 이용안내

▶ 인터넷뱅킹

- banking.nonghyup.com
- 각종조회, 이체, 예·적금/편도신규, 대출실행

▶ 텔레뱅킹

- 전국 어디서나 **1588-2100**
지역번호 없이 **1544-2100**
- 해외에서 이용시 **82-2-3704-1004**

안내 말씀

▶저희 농협은행을 이용하여 주셔서 감사합니다.

1. 이 통장의 거래에는 저희 은행의 예금거래기본약관 및 해당 예금약관이 적용되며, 약관은 언제나 저희 영업점 또는 인터넷홈페이지(banking.nonghyup.com)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 통장, 도장 등을 분실하거나 주소, 연락처 등이 바뀌면 바로 가까운 영업점 또는 콜센터(1588-2100, 1544-2100)로 알려 주십시오.
3. 통장, 도장은 따로 보관하시는 것이 안전하며, 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주시기 바랍니다.

농협 인터넷뱅킹에서 제공해드린 통장사본입니다.

본 사본은 고객보관용으로 어떠한 용도의 증명서로도 사용하지 않습니다.

원본대조필



- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

NH Bank

튼튼한 민족은행 - 농협!

계좌번호 317-0007-5975-91
예금종류 하도급관리계좌(하도급지킴이)

(주)아산  노무비계좌



가입하신 날 : 2014/06/09
계좌관리 점포 : 남양주시지부(T:031-563-5991)
통장발행 점포 : 인터넷뱅킹

 NH농협은행

인터넷통장사본 발행일 : 2020년 07월 30일

전자금융 이용안내

▶ 인터넷뱅킹

- banking.nonghyup.com
- 각종조회, 이체, 예·적금/편도신규, 대출실행

▶ 텔레뱅킹

- 전국 어디서나 **1588-2100**
지역번호 없이 **1544-2100**
- 해외에서 이용시 **82-2-3704-1004**

안내 말씀

▶저희 농협은행을 이용하여 주셔서 감사합니다.

1. 이 통장의 거래에는 저희 은행의 예금거래기본약관 및 해당 예금약관이 적용되며, 약관은 언제나 저희 영업점 또는 인터넷홈페이지(banking.nonghyup.com)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 통장, 도장 등을 분실하거나 주소, 연락처 등이 바뀌면 바로 가까운 영업점 또는 콜센터(1588-2100, 1544-2100)로 알려 주십시오.
3. 통장, 도장은 따로 보관하시는 것이 안전하며, 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주시기 바랍니다.

농협 인터넷뱅킹에서 제공해드린 통장사본입니다.
본 사본은 고객보관용으로 어떠한 용도의 증명서로도 사용하지 않습니다.

원본대조필



- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

NH Bank

든든한 민족은행 - 농협!

계좌번호 1247-01-000121

예금종류 보통예금

(주)아산 **님**



가입하신 날 : 2007/03/14

계좌관리 점포 : 남양주지점(T:031-559-8640)

통장발행 점포 : 인터넷뱅킹

NH농협은행

인터넷통장사본 발행일 : 2020년 07월 30일

전자금융 이용안내

▶ 인터넷뱅킹

- banking.nonghyup.com
- 각종조회, 이체, 예·적금/편드신규, 대출실행

▶ 텔레뱅킹

- 전국 어디서나 **1588-2100**
- 지역번호 없이 **1544-2100**
- 해외에서 이용시 **82-2-3704-1004**

안 내 말 씀

▶ 저희 농협은행을 이용하여 주셔서 감사합니다.

1. 이 통장의 거래에는 저희 은행의 예금거래기본약관 및 해당 예금약관이 적용되며, 약관은 언제나 저희 영업점 또는 인터넷홈페이지(banking.nonghyup.com)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 통장, 도장 등을 분실하거나 주소, 연락처 등이 바뀌면 바로 가까운 영업점 또는 콜센터(1588-2100, 1544-2100) 로 알려 주십시오.
3. 통장, 도장은 따로 보관하시는 것이 안전하며, 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주시기 바랍니다.

농협 인터넷뱅킹에서 제공해드린 통장사본입니다.

본 사본은 고객보관용으로 어떠한 용도의 증명서로도 사용하지 않습니다.

원본대조필



- 고객님의 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다.
- 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다.
- 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.

15. 기 타 서 류 (사 업 자 등 록 증 외)



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 132-81-13913

법인명(단체명) : (주) 아산

대 표 자 : 진익주

개 요 요 문 일 : 1996 년 07 월 15 일 법인등록번호 : 114711-0001947

사업장 소재지 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층(지금동)

본 점 소 재 지 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층(지금동)

사 업 의 종 류 : ☒업태 건설업
☐건설업

토목공사업
조경공사업

발 급 사 유 :



사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 : msla33@naver.com

TEL:031-564-9408, FAX:031-564-9403

2017년 11월 08일

남양주세무서장



원본대조필



건설업등록증

업종 : 토목공사업 등록번호 : 10-5243
 상 호 : (주)미 산 대 표 자 : 이 성 도
 영업소재지 : 구리시 수택동 849-5 광희빌딩 603호 법인(주만)등록번호 : 114711-0001947
 국 적 또 는 소 속 국 가 명 : 대 한 민 국 등 록 일 자 : 2009. 03. 26
 면허유효기간 : 갱 신 년 월 일 : 2012. 6. 12

건설산업기본법 제9조의 규정에 의한 건설업자임을
 증명합니다.

2009 년 03 월 27 일

경 기 도 지 사



변 경 사 항			
변경년월일	변 경 구 분	변 경 내 용	기록년월일 · 기록자(인)
2013. 2. 14	상 호 대 표 자	(주) 아 산 진 익 주 대한건설협회경기도회부	2013. 2. 22
2013. 3. 12	소 재 지	남양주시 진관로 32-10 (자곡동) 대한건설협회경기도회부출장소	2013. 3. 25

210mm × 297mm 보존용지(1종) 120g/㎡

원본대조필



변 경 사 항			
변경년월일	변경구분	변경내용	
2015. 4. 10	소재지	남양주시 미음로 189번길 109 (지음동)	2015. 5. 7

대한건설협회경기도회북부출장소

건설업등록사항의 주기적 신고		
신고 수리일	차기 신고기간	기록년월일 기록확인
2015. 11. 30.	2018. 11. 30.	2016. 02. 12.

변 경 사 항			
변경년월일	변경구분	변경내용	기록지
2017. 8. 2	소재지 <적원변경으로 인한 도로명주소 변경>	남양주시 다산중앙로 146번길 70-123 (지음동)	2017. 11. 17

대한건설협회경기도회북부출장소

변 경 사 항			
변경년월일	변경구분	변경내용	
2018. 2. 19	소재지	남양주시 다산중앙로 146번길 70-123 (다산동)	2018. 3. 8

대한건설협회경기도회북부

원본대조필



건설업등록수첩			
업종	토목공사업	등록번호	10-1243
상호	(주)미산		
대표자	이성도		
영업소재지	구리시 우택동 889-5 광리빌딩 603호		
법인(주인) 등록번호	114911-0001949		
국적또는 소속국가명	대한민국	등록일자	2009. 03. 26
면유효기간		갱년월일	
건설산업기본법 제9조의 규정에 의한 건설업자임을 증명합니다. 2009년 03월 26일 경기도지사			

-3-

105mm x 148mm
보존용지(1종) 120g/m²

변경사항			
변경년월일	변경구분	변경내용	기록년월일 기록자(인)
2013. 2. 14	상호 대표자	(주)아산 정익주	2013. 2. 27
2013. 3. 12	소재지	남양주시 진광동 32-10 (지상동)	2013. 3. 27

-4-

105mm x 148mm
보존용지(1종) 120g/m²

변경년월일	변경구분	변경내용	기록년월일 기록자(인)
2015. 4. 10	소재지	남양주시 대곡로 189번길 109 (지상동)	2015. 5. 7
2019. 8. 2	소재지 (정착면적에 관한 도로명주소 변경)	남양주시 다산중앙로 146번길 110-123 (지상동)	2019. 11. 13

-5-

105mm x 148mm
보존용지(1종) 120g/m²

변경년월일	변경구분	변경내용	기록년월일 기록자(인)
2018. 2. 19	소재지	남양주시 다산중앙로 146번길 110-123 (다산동)	2018. 3. 2

-6-

105mm x 148mm
보존용지(1종) 120g/m²

(1/2)

원본대조필



행정처분사항			
처분년월일	처분내용	처분근거	기록년월일 기록자(인)
	전설업등록사항의 주기적 신고		
신고일자	신고 수리일자	차기 신고기간	기록 기록자
	2012. 6. 12 2015. 11. 30	2015. 6. 12 ~ 7. 11 2018. 11. 30	2012. 6. 25 2016. 02. 12

- 8 - 105mm x 148mm
보존용지(1종) 120g/m²

시공능력			
연도	공사의종류	금액(백만원)	기록년월일 기록자(인)
2008	토목	6.046	09.3.3
2009	"	6.151	09.8.7
2010	"	8.600	10.8.12
2011	"	9.649	2011.8.1
2012	"	8.150	2012.7.7
2013	"	5.980	
2014	"	7.096	
2015	"	12.468	
2016	"	12,115.8	
2017	"	5.923	
2018	"	5.585	
2019	"	4.780	

- 9 - 105mm x 148mm
보존용지(1종) 120g/m²

시공능력			
연도	공사의종류	금액(백만원)	기록년월일 기록자(인)
2020	토목	2.425	20.7.1

보존용지(1종) 120g/m²

(2/2)

원본대조필

경영상태 등의 확인서

상 호: (주)아산

대표자: 진익주

소재지: 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123(다산동)

업종	토목건축	토목	건축	산업·환경설비	조경
등록번호		105243			105037

1.경영상태 평가자료 입찰공고일:2026.03.20
(단위:천원)

구분	경영비율	산출근거			
가. 부채비율	20.91%	부채총계	1,075,241	자기자본	5,140,057
나. 유동비율	332.87%	유동자산	2,801,210	유동부채	841,511
다. 차입금의존도	3.76%	차입금	233,730	총자산	6,215,299
라. 영업이익대비이자보상배율	71.40배	영업이익	188,588	이자비용	2,641
마. 매출액순이익률	4.84%	법인세차감전순이익	187,496	총매출액	3,871,162
바. 총자산순이익률	3.01%	법인세차감전순이익	187,496	총자산	6,215,299
사. 총자산대비영업현금흐름비율	자료미제출	영업활동현금흐름		총자산	
아. 자산회전율	0.61회	매출액	3,871,162	(기초+기말자산)/2	6,276,562
자. 건설기술개발투자비율	0.00%	건설기술개발비	0	건설매출액	3,871,162

감 사 의 건

행정안전부예규 지방자치단체 시설공사자격심사세부기준에 의거 발급

1.경영항목 : 2024-12-31 기준 정기결산서(재무제표)에 의거 2025-07-01 등록



귀 회사의 경영상태 내용을 확인합니다.

2026년 04월 03일

대한건설협회장



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 대한건설협회 인터넷증명발급 홈페이지(cert.cak.or.kr) [발급문서확인] 메뉴에서 문서상단의 발급번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 진위 여부를 확인하실 수 있습니다.



시공능력평가액 확인서

상 호 : (주)아산
대표자 : 진익주
소재지 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123(다산동)

업종	토목건축	토목	건축	산업·환경설비	조경
등록번호		105243			105037

기준년도 : 2025년도

(단위:백만원)

업 종	순위	시공능력평가액
토목	1,931 (전체 5,022위 중)	4,833
조경	336 (전체 1,382위 중)	16,141

CAK

※ 상기 순위는 2025년08월01일 경기공시 적용일자 기준입니다.

- "토목", "건축" 업종은 "토목건축" 업종을 제외한 단일 등록업종 순위이며, 경기공시 이후
신규, 업종변경, 합병, 양수도 등으로 시공능력평가액 재산정 업체는 순위가 없을 수 있습니다.

시공능력평가액을 확인합니다.


2026년 04월 03일

대한건설협회장



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 대한건설협회 인터넷증명발급 홈페이지(cert.cak.or.kr) [발급문서확인] 메뉴에서 문서상단의
발급번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 진위 여부를 확인하실 수 있습니다.

원본대조필



부정당업자 제재처분 확인서

1/1

상 호 : (주)아산

대표자 : 진익주

소재지 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123(다산동)

업종	토목건축	토목	건축	산업·환경설비	조경
등록번호		105243			105037

입찰공고일 : 2026.03.20

적용기준일자 : 2024.03.21 ~ 2026.03.20

총 건수: 0

일련 번호	처분일자	처분내용 상세내용(근거) 해당업종 제재취소내역(효력정지,처분취소등)	처분사유	처분기관
----------	------	---	------	------

해당사항없음



※ 위 확인서의 내용은 조달청 G2B시스템에서 확인된 사항임.
※ 동 확인서의 내용은 발주청에서 적용시 조달청 G2B시스템에 등록된 자료와 대조/확인하시기 바랍니다.

우리 협회에서 파악한 부정당업자 제재처분 내역을 확인합니다.

2026년 04월 03일


대한건설협회장



원본대조필



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 대한건설협회 인터넷증명발급 홈페이지(cert.cak.or.kr) [발급문서확인] 메뉴에서 문서상단의 발급번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 진위 여부를 확인하실 수 있습니다.






등기사항전부증명서(말소사항 포함)

등기번호	011371	
등록번호	114711-0001947	
상 호	주식회사 아산	2013.02.14 변경 2013.02.15 등기
본 점	경기도 남양주시 진관로 32-10(지급동)	.
	경기도 남양주시 미금로189번길 109(지급동)	2015.04.10 변경 2015.04.14 등기
	경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123(지급동)	2017.08.02 도로 명주소변경 2017.11.03 등기
	경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123(다산동)	2017.12.18 행정 구역변경 2018.02.19 등기
공고방법	서울시내에서 발행하는 일간 대한매일신문에 게재한다.	.
1주의 금액	금 10,000 원	.
발행할 주식의 총수	260,000 주	.
발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수		변 정 연 월 일 등 기 연 월 일
발행주식의 총수	140,000 주	.
보통주식	140,000 주	.
자본금의 액		.
금 1,400,000,000 원		.
목 적		
1. 토목공사업 2. 건축공사업 3. 건설공사업 4. 오수정화조 시설 설계 시공업 5. 정화조 설계 시공업 6. 축산 폐수 정화시설 설계 시공업 7. 건축자재매매업 8. 골재채취 및 매매업 9. 시설물유지관리업 10. 유가증권매매업 11. 분양대행업 12. 부동산임대사업		

원본대조필



문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



등기번호	011371
------	--------

13. 부동산매매업
14. 주차장사업
15. 빌딩관리업
16. 주택건설업
17. 대지조성업
18. 전기공사업
19. 통신공사업
20. 소방공사업
21. 조경공사업
22. 위 항에 관련된 사업

임원에 관한 사항

~~이사 장대진 550826-1024321~~

2006 년 03 월 22 일 취임 2006 년 03 월 23 일 등기

~~사내이사 장대진 550826-1024321~~

2009 년 03 월 22 일 중임 2009 년 04 월 03 일 등기

2012 년 03 월 22 일 중임 2012 년 04 월 02 일 등기

2015 년 03 월 22 일 중임 2015 년 04 월 03 일 등기

2018 년 03 월 22 일 중임 2018 년 03 월 28 일 등기

2021 년 03 월 22 일 임기만료 2021 년 04 월 02 일 등기

~~이사 정용철 681210-1321615~~

2006 년 03 월 22 일 취임 2006 년 03 월 23 일 등기

~~사내이사 정용철 681210-1321615~~

2009 년 03 월 22 일 중임 2009 년 04 월 03 일 등기

2012 년 03 월 22 일 중임 2012 년 04 월 02 일 등기

2015 년 03 월 22 일 중임 2015 년 04 월 03 일 등기

2018 년 03 월 22 일 중임 2018 년 03 월 28 일 등기

2021 년 03 월 22 일 임기만료 2021 년 04 월 02 일 등기

~~이사 진익주 600304-1011355~~

2006 년 03 월 22 일 취임 2006 년 03 월 23 일 등기

~~사내이사 진익주 600304-1011355~~

2009 년 03 월 22 일 중임 2009 년 04 월 03 일 등기

2012 년 03 월 22 일 중임 2012 년 04 월 02 일 등기

2015 년 03 월 22 일 중임 2015 년 04 월 03 일 등기

2018 년 03 월 22 일 중임 2018 년 03 월 28 일 등기

2021 년 03 월 22 일 중임 2021 년 04 월 02 일 등기

2024 년 03 월 22 일 중임 2024 년 03 월 29 일 등기

~~감사 정봉선 670222-1055911~~

2012 년 03 월 22 일 취임 2012 년 04 월 02 일 등기

2015 년 03 월 22 일 중임 2015 년 04 월 03 일 등기

2018 년 03 월 22 일 중임 2018 년 03 월 28 일 등기

2021 년 03 월 22 일 임기만료 2021 년 04 월 02 일 등기

대표이사 진익주 600304-1011355 경기도 남양주시 도농로 34, 508동 1201호(도농동, 부영그린타운)

원본대조필

등기번호	011371
2013 년 02 월 14 일 취입 2013 년 02 월 15 일 등기 대표이사 권익주 600304-1011355 경기도 남양주시 별내면 송산로406번길 16-2 2014 년 06 월 24 일 주소변경 2014 년 06 월 24 일 등기 대표이사 권익주 600304-1011355 경기도 남양주시 도농로 34, 508동1201호(도농동, 부영그린타운) 2014 년 12 월 10 일 주소변경 2014 년 12 월 23 일 등기 2015 년 03 월 22 일 중임 2015 년 04 월 03 일 등기 대표이사 권익주 600304-1011355 경기도 남양주시 도농로 34, 304동901호(도농동, 부영그린타운) 2017 년 01 월 26 일 주소변경 2017 년 02 월 15 일 등기 대표이사 권익주 600304-1011355 경기도 남양주시 도농로 34, 304,901호(다산동, 부영그린타운) 2017 년 12 월 18 일 행정구역변경 2018 년 03 월 28 일 등기 2018 년 03 월 22 일 중임 2018 년 03 월 28 일 등기 2021 년 03 월 22 일 중임 2021 년 04 월 02 일 등기 대표이사 권익주 600304-1011355 경기도 남양주시 도농로 34, 304,901호(다산동, 플루리움) 2021 년 10 월 01 일 공동주택변경 2024 년 03 월 29 일 등기 2024 년 03 월 22 일 중임 2024 년 03 월 29 일 등기	
사내이사 정봉선 670222-1055911 2021 년 03 월 22 일 취입 2021 년 04 월 02 일 등기 2024 년 03 월 22 일 중임 2024 년 03 월 29 일 등기	
사내이사 정용원 751130-1067322 2021 년 03 월 22 일 취입 2021 년 04 월 02 일 등기 2024 년 03 월 22 일 중임 2024 년 03 월 29 일 등기	
감사 이좌근 600621-1009019 2021 년 03 월 22 일 취입 2021 년 04 월 02 일 등기 2024 년 03 월 22 일 중임 2024 년 03 월 29 일 등기	

회사성립연월일 1984 년 11 월 19 일

등기기록의 개설 사유 및 연월일
 2013년 03월 12일 경기도 구리시 수택동 849-5 광희빌딩 603호로부터 본점이전
 2013 년 03 월 14 일 등기

— 이 하 여 백 —


관할등기소 의정부지방법원 남양주지원 등기과 / 발행등기소 의정부지방법원 남양주지원 등기과
 수수료 1,000원 영수함

원본대조필



등기번호

011371

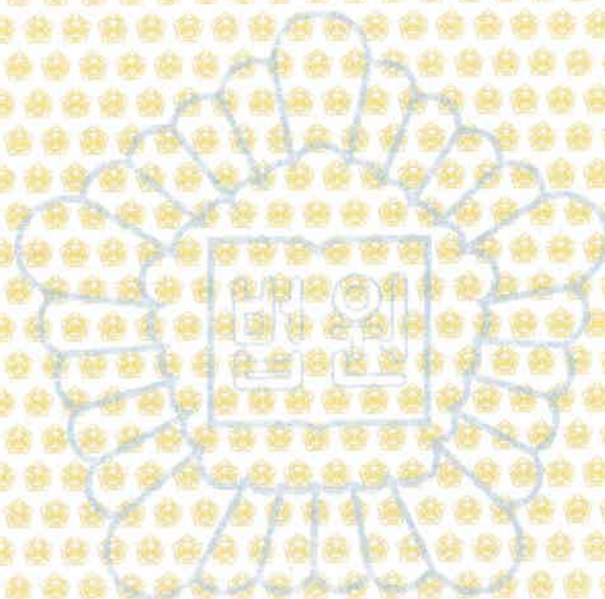

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
[다만, 신청이 없는 지점·지배인에 관한 사항의 기재를 생략하였습니다]
서기 2026년 03월 30일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함.

원본대조필

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 116458220410100032310062200127130151TOM10111448822C 2

발급확인번호 3713-BCPM-XMBN

발행일 2026/03/30

사 용 인 감 계

사
용
인
감



상 호 : (주) 아 산
주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123
대 표 자 : 대표이사 진 익 주

위 인감은 본인이 사용하는 인감으로서, 법률상의 모든 책임은
본인(당사)이 질 것을 확약하고, 인감증명서를 첨부하여 제출합니다.

2026년 03월 일

상 호 : (주) 아 산
주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123
대 표 자 : 대표이사 진 익 주 (인)



의정부국토관리사무소장 귀하



인 감 증 명 서



법인등록번호 : 114711-0001947



상 호 : 주식회사 아산

본 점 : 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123(다산동)

대표이사 진익주

(600304-1011355)

관할등기소 : 의정부지방법원 남양주지원 등기과 / 발행등기소 : 의정부지방법원 남양주지원 등기과

이 인감은 등기소(과)에 제출되어 있는 인감과 틀림없음을 증명합니다.

2026년 03월 30일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



수수료 1,000원 영수함.

1. 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 인감증명서 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
2. 법인인감증명서 발급사실 등 문자전송 서비스를 신청하면, 발급사실을 휴대폰 문자로 통보받을 수 있습니다. (전국 등기소 및 인터넷등기소에서 신청 가능)

210428420110100031310065200127130151TOM10111448822C 1

발급확인번호 RBAP-BMXM-XUGO

- 1/1원본대조필





(1 / 1)

납 세 증 명 서

발급번호	3967-295-8354-655	처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)				
납세자	성명(상호) (주) 아산	주민등록번호(사업자등록번호)	132-81-13913				
인적사항	주소(사업장) 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123, 2층(다산동)						
증명서의 사용목적	☒ 대금수령						
	☐ 해외이주						
	☐ 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2026년 05월 03일					
	유효기간을	☒ 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항					
	정한 사유	☐ 기타(사유:)					
연장·유예 내역 (단위 : 원)	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세목	납부기한	세액	가산금
		해	당	없	음		
물적납세의무 채납내역 (단위 : 원)	위탁자·양도담보설정자	과세기간	세목	납부기한	세액	가산금	
	해	당	없	음			

「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.
※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 채납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.


담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	031-326-7224

2026년 4월 3일

구리세무서장



◆ 본 증명서는 정부24에서 발급된 증명서로 문서하단의 바코드로 진위확인이 가능하며, 국세청 홈택스(hometax.go.kr)에서도 문서발급번호로 90일간 진위확인을 하실 수 있습니다.



원본대조필





문서확인번호 : 1775-1929-2098-5688



지방세 납세증명(신청)서
Local Tax Payment Certificate(Application)

(1/1)

발급번호 Issuance Number	6413881	접수일시 Time and Date of receipt	2026-04-03 14:07:14	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name) 아산		주민(법인, 외국인)등록번호 Resident (Corporation • Foreign) Registration No. 114711-0001947		
	주소(영업소) Resident Address (Business Address) 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123 2층				
	전화번호(휴대전화) Phone No. (Mobile Phone No.) 031-564-9407				
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	☐ 대금수령 [] Billing	대금 지급자 Payer			
	☐ 해외이주 [] Emigration	이주번호 Emigration No.			
	☐ 부동산 신탁등기 [] Registration for Real Estate Trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of Real Estate Trust (Location, Building Name and No.)			
	☒ 그 밖의 목적 [V] Others	착공계제출			
증명서 신청부수 Copies of Certificate		1 부 Copy(Copies)			

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.
Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amount stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

2026년(Year) 04월(Month) 03일(Day)

신청인(납세자) 아산 (서명 또는 인)
Applicant(Taxpayer) (Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예 등 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax
- 해당 사항 없음(None) -						
물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities in Tax Arrears						
위탁자·양도담보설정자·명의신탁자 Trustor • Debtor in Security Interest • Title Trustor	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax	
- 해당 사항 없음(None) -						

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.
I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.




1. 증명서 유효기간 : 2026년(Year) 05월(Month) 03일(Day)
Validity Period:
2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)
Reason for validity Period:

남 양 주 시 장
The Mayor of Namyangju

2026년(Year) 04월(Month) 03일(Day)



◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.



원본대조필

발급번호	☒ 고용보험 ☒ 산재보험				가입 증명원	
2080-2026-040300052						
사업장명	(주)아산					
소재지	[12249] 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123					
보험가입자(대표자)	진익주		사업자등록번호 (법인등록번호)	132-81-13913 (114711-0001947)		
사업장관리번호 (사업개시번호)	고용보험	132-81-13913-0	적용형태	☒ 개별 ☐ 일괄		
	산재보험	132-81-13913-0				
	(사업개시번호)					
성립일자	고용보험	1998-03-01	소멸일자	고용보험		
	산재보험	1998-05-01		산재보험		
	사업개시일			사업종료일		
사업의 종류	고용보험	건설업본사				
	산재보험	건설업본사				
용도	법원제출용					

※ 아래의 내용은 개별 가입된 유가공사 또는 사업개시번호의 가입내역을 확인하는 경우에만 표기됩니다.

지점명(공사장명)			
지점주소 (공사장 소재지)	[]		
사업기간(공사기간)	~	총공사금액	원
원수급인상호(법인명)			
원수급인 소재지	[]		
발주자명			
발주자 소재지	[]		

위와 같이 고용·산재보험 가입내역을 증명합니다.

2026년 04월 03일



근로복지공단 남양주지사장



담당자 이진욱




전화번호 031-524-7060

원본대조필



발급번호	☒ 고용보험료 ☒ 산재보험료		완납증명서	
2080-20260403-00171				
사업장관리번호	132-81-13913-0			
사업장명(공사명)	(주)아산			
사업장소재지	[12249] 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123			
보험가입자(대표자)	진익주	생년월일	1960-03-04	사업자등록번호 (법인등록번호)
				132-81-13913 (114711-0*****)
고용보험	성립일	1998-03-01	소멸일	사업종류 건설업본사
산재보험	성립일	1998-05-01	소멸일	사업종류 건설업본사
※ 아래의 내용은 일괄계속사업장의 사업개시신고 내역을 확인하는 경우에만 표기됩니다.				
사업개시번호	사업개시명			
용도	제출용	제출기관	국가지자체공공기관	
징수유예 내역	징수유예액	0 원		
	징수유예시작일			
완납증명서 발급일 현재 징수유예액을 제외하고 체납보험료가 없음을 증명합니다. (이 증명서는 납부기한이 도과하지 않은 보험료의 수납여부를 증명하지 않습니다) 2026년 04월 03일 근로복지공단 남양주지사장 				
※ 법인사업장은 동일 사업자등록번호로 등록된 모든 사업장의 고용 산재보험료 완납 시 발급됩니다. ※ 개인사업장은 대표자 주민등록번호로 등록된 모든 사업장의 고용 산재보험료 완납 시 발급됩니다. ※ 중소기업사업주(가족종사자) 및 자영업자의 경우 요청한 관리번호의 보험료 완납 시 발급됩니다.				

원본대조필

발급번호	☒ 고용보험 ☒ 산재보험 가입 증명원				
2080-2026-040300053					
사업장명	(주)아산				
소재지	[12249] 경기 남양주시 다산중앙로146번길 70-123 (지금동)				
보험가입자(대표자)	진익주	사업자등록번호 (법인등록번호)	132-81-13913 (114711-0001947)		
사업장관리번호 (사업개시번호)	고용보험	132-81-13913-6	적용형태	☐ 개별 ☒ 일괄	
	산재보험	132-81-13913-6			
	(사업개시번호)	926-03-33503-7			
성립일자	고용보험	2003-01-01	소멸일자	고용보험	
	산재보험	2001-01-01		산재보험	
	사업개시일	2026-04-01		사업종료일	
사업의 종류	고용보험	사무상업용 및 공공기관용 건물 건설업			
	산재보험	건축건설공사			
용도	제출용				

※ 아래의 내용은 개별 가입된 유기공사 또는 사업개시번호의 가입내역을 확인하는 경우에만 표기됩니다.

지점명(공사장명)	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공		
지점주소 (공사장 소재지)	[12142] 경기 남양주시 호평ic교(상)		
사업기간(공사기간)	2026-04-01 ~ 2026-07-29	총공사금액	556,811,546 원
원수급인상호(법인명)			
원수급인 소재지	[]		
발주자명	국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소(국토교)		
발주자 소재지	[]		

위와 같이 고용·산재보험 가입내역을 증명합니다.

2026년 04월 03일


근로복지공단 남양주지사장



담당자 박재성


전화번호 031-524-7055

원본대조필



발급번호	☒ 고용보험료		완납증명서	
2080-20260403-00172	☒ 산재보험료			
사업장관리번호	132-81-13913-6			
사업장명(공사명)	(주)아산			
사업장소재지	[12249] 경기 남양주시 다산중앙로146번길 70-123 (지금동)			
보험가입자(대표자)	진익주	생년월일	1960-03-04	사업자등록번호 (법인등록번호)
				132-81-13913 (114711-0*****)
고용보험	성립일	2003-01-01	소멸일	사업종류
				사무상업용 및 공공기관용 건물 건설업
산재보험	성립일	2001-01-01	소멸일	사업종류
				건축건설공사
※ 아래의 내용은 일괄계속사업장의 사업개시신고 내역을 확인하는 경우에만 표기됩니다.				
사업개시번호	사업개시명			
926-03-33503-7	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공			
용도	제출용	제출기관	국가지자체공공기관	
징수유예 내역	징수유예액	0 원		
	징수유예시작일			
완납증명서 발급일 현재 징수유예액을 제외하고 체납보험료가 없음을 증명합니다. (이 증명서는 납부기한이 도과하지 않은 보험료의 수납여부를 증명하지 않습니다) 2026년 04월 03일 근로복지공단 남양주지사장 				
※ 법인사업장은 동일 사업자등록번호로 등록된 모든 사업장의 고용 산재보험료 완납 시 발급됩니다. ※ 개인사업장은 대표자 주민등록번호로 등록된 모든 사업장의 고용 산재보험료 완납 시 발급됩니다. ※ 중소기업사업주(가족종사자) 및 자영업자의 경우 요청한 관리번호의 보험료 완납 시 발급됩니다.				

원본대조필



4대 사회보험료 완납증명서

보험구분	☒ 건강 ☒ 연금 ☐ 고용 ☐ 산재 *가입(납부)이력이 있는 보험만 표출(☒) 됩니다.			
대상	법인사업장			
	통합납부자번호 (사업장관리번호)	57020363091 (13281139130)	사업자등록번호	132-81-13913
	사업장명	(주)아산		
	소재지	경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123 (다산동)		
발급용도	국가, 지방자치단체, 공공기관 제출용			

발급일 현재 징수유예액 또는 체납처분유예액을 제외하고는
체납한 보험료, 연체금, 체납처분비가 없음을 증명합니다.

증명서 유효기간 : 2026년 04월15일

2026년 04월 03일

국민건강보험공단 이사장

- ※ 국민건강보험법 제14조, 제81조의4, 국민연금법 제88조, 제95조의2, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제4조, 제29조의4 규정에 의거하여 이 증명서는 국민건강보험공단에서 발급 합니다.
- ※ 개인사업장은 대표자 주민등록번호를 기준으로 조회되는 보험료(지역, 사업장)를 완납한 경우 발급됩니다.
- ※ 법인사업장은 동일 사업자등록번호를 기준으로 모든 사업장이 가입한 건강, 연금, 고용, 산재보험료를 완납한 경우 발급됩니다.
- ※ 이 증명서는 건설업 및 발목업 등 고용, 산재보험료 자진신고 대상 사업장의 고용, 산재보험료 완납여부는 포함되지 않습니다.
- ※ **입찰참여 및 대금지급 시 공단 홈페이지(www.nhis.or.kr) '증명서 진위확인' 메뉴를 통해 진위 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.**
(발급일로부터 90일까지 확인 가능) 단, 팩스로 발급받은 경우는 이력 조회만 확인 가능합니다.
- ※ 증명서 위변조 시 형법 제231조, 형법 234조 규정에 따라 처벌받을 수 있음을 알려드립니다.

원본대조필





건설기계대여대금지급보증서(현장별보증)

보증서번호 제 202600049697 호

보증금액	일금 칠천칠백팔만팔천육십원	(₩77,088,060)
계약금액	일금 오억칠천일백이만이천칠백원	(₩571,022,700)
건설기계 선급금	일금 원	(₩0)
도급계약명	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사	
계약(예정)일	2026년 03월 27일	
계약이행기일	2026년 07월 29일	
보증기간	2026년 04월 01일부터 2026년 10월 27일 까지	
계약자	상호 (주)아산	대표자 진익주
특기사항	1. 이 보증서에 첨부된 약관에는 보증채권자의 권리행사에 영향을 주는 의사사항등이 포함되어 있으므로 잘 읽어보시기 바랍니다. 2. 이 보증서는 대금지급기일(어음 등의 경우 만기일)이 보증기간내에 도래하지 않는 경우의 해당채무는 보증책임을 부담하지 아니하므로 보증기간내에 반드시 보증기간의 연장을 받으셔야 합니다. 3. 이 보증서에 의한 보증책임을 조합에 제출된 건설기계대여계약서에 따라 조합이 개별확정하는 금액을 한도로 보증책임을 부담합니다.	

위 보증금은 이 보증서에 기재된 내용과 약관에 따라 건설산업기본법에 의하여 우리조합이 이를 보증합니다.

2026년 03월 27일

건설공제조합
Construction Guarantee

서울시 강남구 언주로 711

건설산업기본법 제68조의3 제1항에 따른 건설
기계대여대금지급채권자 귀하

발급영업점 : 서울금융센터, 02-3449-8830
서울특별시 강남구 테헤란로 201 14층 (역삼동, 아주빌딩)
서울보증센터 : 02-3449-8750
고객상담실 : 1588-1444

이사장 이 석 용

대리인 서울금융센터장 우승주

이 보증서는 대리인의 직인이 없으면 무효입니다.

원본대조필

※ 보증서 발급사실 및 약관은 건설공제조합 홈페이지(www.cgbest.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
우리 조합은 약관에 따라 보증책임을 부담하므로 약관내용을 자세히 읽어보시기 바랍니다.

계약 보증서

보증서번호 제 001002G0014202600049663A0100 호

보증금액	일금 팔천오백육십오만삼천사백오원	(₩ 85,653,405)
계약금액	₩ 571,022,700	
계약명	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사	
계약이행기일	2026년 07월 29일	
보증기간	2026년 03월 27일 부터 2026년 07월 29일	
계약자	상호 : (주)아산 대표자 : 진익주	
특기사항	1. 위 보증기간에도 불구하고 당해 계약의 실제이행기일까지 보증 책임을 부담합니다.	

위 보증금은 이 보증서에 기재된 내용과 별도 협약에 의해 전송 또는 게시한 약관에 따라 건설산업기본법에 의하여 우리조합이 보증합니다. 또한, 동 약관은 우리조합 홈페이지(www.cgbest.co.kr)에서도 확인할 수 있사오니 참고하시기 바랍니다.


2026년 03월 27일

이사장 이석용
대리인 서울금융센터장 우승주

국토교통부 서울지방국토관리청 의
정부국토관리사무소귀하

연락처 :

홈페이지주소 : <http://www.cgbest.co.kr>



특허 기술 사용 협약서

1.특허명칭	시트식 복합방수재 및 이를 이용한 교면 방수층 시공방법
2.특허등록번호	특허 제10-2007339호
3.특허구분	교면방수층 시공방법
4.특허내용	-자외선에 노출된 콘크리트 구조물과 교면도막용으로 보수부위의 단면을 성능개선 및 유지
5.협약내용	-상기 1항의 특허기술을 10항 기술사용자에게 특허 기술에 대한 실시간 사용을 계약하고,본 특허공법을 적용 시공하는 공사에 부실시공 방지노력(시방서,관계법령 준수) 및 성실 시공으로 실시권자의 권익을 보호한다. -본 협약은 "국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소"에서 발주한 "제6항 공사내용"에 명시한 공사에 대하여 적용하는 것으로 한정한다.
6.공사내용	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
7.사용기간	상기 공사 계약일에서 ~ 상기 공사 준공시까지
8.협약체결일	2026.04.01
9.기술제공자 (첨부서류참조)	주 소 : 전라남도 장성군 남면 황토단감로88-10, 3동 1층 상 호 : (주) 제이제이종합건설 대 표 : 정 승 래 (인)
10.기술사용자 기술사용협약)	주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로 146번길 70-123 2층 상 호 : (주) 아 산 대 표 : 진 익 주 (인)

원본대조필



발급번호 : 2-5-2025-193512917



특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-2007339 호
Patent Number

출원번호 제 10-2018-0095396 호
Application Number

출원일 2018년 08월 16일
Filing Date

등록일 2019년 07월 30일
Registration Date

발명의명칭 Title of the Invention
시트식 복합 방수재 및 이를 이용한 교면 방수층 시공 방법

특허권자 Patentee
등록사항란에 기재

발명자 Inventor
정승태 (780727-*****)
광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10, 304동 1304호 (장덕동, 성덕마을 대방노블렌드3차 아파트)

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Ministry of Intellectual Property.






2025년 11월 17일

지식재산처장
MINISTER,
MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

김 용 선



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



등 록 사 항

특 허 제 10-2007339 호

Patent Number

특허권자 Patentees

정승래(780727-*****)

광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10, 304동 1304호 (장덕동, 성덕마을
대방노블랜드3차 아파트)

(주)성보종합건설(164711-*****)

충청남도 계룡시 서금암3길 5 ,519호(금암동)

(주)제이제이종합건설(205911-*****)

전라남도 장성군 장성읍 단풍로 145, 2-4호

(주)산동산업(200111-*****)


광주광역시 광산구 왕버들로 217, 3층(수완동, 한들레포츠)

창천기술 주식회사(200111-*****)

광주광역시 광산구 왕버들로 217, 307호 (수완동)

1

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)의 '특허로-증명서발급' 메뉴를 통해 발급번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 단, 발급번호를 통한 확인은 90일까지 가능합니다.





특허등록원부

특 허 번 호	제 2007339 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항
1번	출원연월일 2018년 08월 16일 출원번호 2018-0095396
	공고연월일 2019년 08월 05일 공고번호 -
	특허결정(심결)연월일 2019년 07월 25일 청구범위의 항수 3
	분류기호 E01D 19/08, E01D 19/12, E01D 21/00
	발명의 명칭 시트식 복합 방수재 및 이를 이용한 교면 방수층 시공 방법
	존속기간(예정)만료일 2038년 08월 16일
	2019년 07월 30일 등록



[특 허 료 란]

제 01 - 03 년분 (2019.07.30 ~ 2022.07.30)	금 액 48,600 원 (개인감면)	2019년 07월 30일 납입
제 04 - 04 년분 (2022.07.31 ~ 2023.07.30)	금 액 106,000 원	2022년 07월 18일 납입
제 05 - 05 년분 (2023.07.31 ~ 2024.07.30)	금 액 106,000 원	2023년 07월 07일 납입
제 06 - 06 년분 (2024.07.31 ~ 2025.07.30)	금 액 96,000 원	2024년 07월 15일 납입
제 07 - 07 년분 (2025.07.31 ~ 2026.07.30)	금 액 192,000 원	2025년 05월 14일 납입

[특 허 권 자 란]

(최종권리자) 정승래 (780727-*****) 광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10, 304동 1304호 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드3차 아파트) (주)성보종합건설 (164711-*****) 충청남도 계룡시 서금암3길 5, 519호 (금암동) (주)제이제이종합건설 (205911-*****) 전라남도 장성군 장성읍 단풍로 145, 2-4호 (주)산동산업 (200111-*****) 광주광역시 광산구 왕버들로 217, 3층(수완동, 한트레포츠) 창천기술 주식회사 (200111-*****) 광주광역시 광산구 왕버들로 217, 307호 (수완동)	
순위번호	등 록 사 항
1번 (등록권리자)	정승래(780727-*****) 광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10, 304동 1304호 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드3차 아파트) 2019년 07월 30일 등록
1번 부기1 (등록권리자의 표시통합관리)	접수 연월일 : 2019년 08월 28일 접 수 번 호 : 2019-5171540 변경 권리자 : 정승래(780727-*****) 광주광역시 광산구 소촌로86번길 20-17, 101동 1304호(소촌동, 대성베르힐) 변 경 사 항 변경전 : 광주광역시 광산구 금봉로 18, 202동501호(소촌동, 소촌2차라인아파트) 변경후 : 광주광역시 광산구 소촌로86번길 20-17, 101동 1304호(소촌동, 대성베르힐) 2019년 08월 28일 등록
1번 부기2 (등록권리자의 표시통합관리)	접수 연월일 : 2022년 07월 12일 접 수 번 호 : 2022-5163509 변경 권리자 : 정승래(780727-*****) 광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-26, 505-701 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드5차) 변 경 사 항 변경전 : 광주광역시 광산구 소촌로86번길 20-17, 101동 1304호(소촌동, 대성베르힐) 변경후 : 광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-26, 505-701 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드5차) 2022년 07월 12일 등록
1번 부기3 (등록권리자의 표시통합관리)	접수 연월일 : 2024년 11월 20일 접 수 번 호 : 2024-5337981 변경 권리자 : 정승래(780727-*****)

원본대소발



	광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10, 304동 1304호 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드3차 아파트) 변경사항 변경전 : 광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-26, 505-701 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드5차) 변경후 : 광주광역시 광산구 풍영로170번길 39-10, 304동 1304호 (장덕동, 성덕마을 대방노블랜드3차 아파트) 2024년 11월 20일 등록
2번	(권리의 일부이전등록) 접수 연월일 : 2019년 09월 09일 접수 번호 : 2019-0617958 등록 의무자 : 정승래(780727-*****) 등록 권리자 : 광주광역시 광산구 소촌로86번길 20-17, 101동 1304호(소촌동, 대성베르힐) : (주)성보종합건설(164711-*****) 충청남도 계룡시 서금암3길 5, 519호(금암동) : (주)제이제이종합건설(205911-*****) 전라남도 장성군 장성을 단풍로 145, 2-4호 등록원인 : 일부양도 등록의 목적 : 권리의 일부이전등록 2019년 09월 09일 등록
2번 부기1	(등록권리자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2020년 02월 28일 접수 번호 : 2020-5045213 변경 권리자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성을 영천로 176 변경사항 변경전 : 전라남도 장성군 장성을 성산길 5 변경후 : 전라남도 장성군 장성을 영천로 176 2020년 02월 28일 등록
2번 부기2	(등록권리자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2020년 03월 24일 접수 번호 : 2020-5069179 변경 권리자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성을 성산리 504-1, 101호 변경사항 변경전 : 전라남도 장성군 장성을 영천로 176 변경후 : 전라남도 장성군 장성을 성산리 504-1, 101호 2020년 03월 24일 등록
2번 부기3	(등록권리자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2020년 10월 20일 접수 번호 : 2020-5235717 변경 권리자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성을 단풍로 256, 101호 변경사항 변경전 : 전라남도 장성군 장성을 성산리 504-1, 101호 변경후 : 전라남도 장성군 장성을 단풍로 256, 101호 2020년 10월 20일 등록
2번 부기4	(등록권리자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2022년 03월 31일 접수 번호 : 2022-5077080 변경 권리자 : (주)제이제이종합건설(205911-*****) 전라남도 장성군 장성을 단풍로 256, 101호 변경사항 변경전 : (주)제이제이산업 변경후 : (주)제이제이종합건설 2022년 03월 31일 등록
2번 부기5	(등록권리자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2023년 04월 04일 접수 번호 : 2023-5082253 변경 권리자 : (주)제이제이종합건설(205911-*****) 전라남도 장성군 장성을 단풍로 145, 2-4호 변경사항 변경전 : 전라남도 장성군 장성을 단풍로 256, 101호 변경후 : 전라남도 장성군 장성을 단풍로 145, 2-4호 2023년 04월 04일 등록
3번	(권리지분의 일부이전등록) 접수 연월일 : 2022년 01월 18일 접수 번호 : 2022-0051886 등록 의무자 : 정승래(780727-*****) 등록 권리자 : 광주광역시 광산구 소촌로86번길 20-17, 101동 1304호(소촌동, 대성베르힐) : (주)산동산업(200111-*****) 광주광역시 광산구 왕버들로 217, 3층(수완동, 한들레포츠) 등록원인 : 지분일부양도 등록의 목적 : 권리지분의 일부이전등록 2022년 01월 18일 등록
4번	(권리지분의 일부이전등록) 접수 연월일 : 2022년 03월 31일 접수 번호 : 2022-0268855 등록 의무자 : 정승래(780727-*****) 등록 권리자 : 광주광역시 광산구 소촌로86번길 20-17, 101동 1304호(소촌동, 대성베르힐) : 창천기술 주식회사(200111-*****) 광주광역시 광산구 왕버들로 217, 307호(수완동) 등록원인 : 지분일부양도 등록의 목적 : 권리지분의 일부이전등록 2022년 03월 31일 등록
4번 부기1	(등록권리자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2025년 07월 30일 접수 번호 : 2025-5209642

원본대조필



	변경 권리자 : 창천기술 주식회사(200111-*****) 광주광역시 광산구 왕버들로 217, 307호 (수완동) 변경 사항 변경전 : 국도산업 주식회사 변경후 : 창천기술 주식회사	2025년 07월 30일 등록
--	---	------------------

[통 상 실 시 권 자 란]

순위번호	등 록 사 항	
1번	(통상실시권의 설정등록) 접수 연월일 : 2020년 03월 02일 접수 번호 : 2020-0157592 등록 의무자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성읍 영천로 176 통상실시권자 : (주)신방건설(200111-*****) 광주광역시 남구 효덕로303번길 5, 5층(송하동) 등 록 원 인 : 통상실시권허여 통상실시권의 범위 기 간 : 2020년 02월 01일부터 2022년 02월 28일까지 지 역 : 경기도, 충청도, 전라도, 광주광역시 실시내용 : 특허법 제2조제3호에 규정한 일체의 실시행위	2020년 03월 02일 등록
1번 부기1	(통상실시권자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2020년 03월 27일 접수 번호 : 2020-5071596 변경 권리자 : 주식회사 신방건설(200111-*****) 광주광역시 남구 효덕로303번길 5, 5층(송하동) 변 경 사 항 변경전 : 광주광역시 광산구 평동산단로 184 ,2층(월전동) 변경후 : 광주광역시 남구 효덕로303번길 5, 5층(송하동)	2020년 03월 27일 등록
2번	(통상실시권의 설정등록) 접수 연월일 : 2020년 07월 09일 접수 번호 : 2020-0496116 등록 의무자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성읍 성산리 504-1, 101호 통상실시권자 : 주식회사 모악엔지니어링(200111-*****) 광주광역시 북구 빛고을대로 716 (용두동) 등 록 원 인 : 통상실시권 허여 통상실시권의 범위 기 간 : 2020년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지 지 역 : 대한민국 전역 실시내용 : 특허법 제2조제3호에 규정한 일체의 실시행위	2020년 07월 09일 등록
3번	(통상실시권의 설정등록) 접수 연월일 : 2021년 05월 06일 접수 번호 : 2021-0355558 등록 의무자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성읍 단풍로 256, 101호 통상실시권자 : 주식회사 우현산업(204311-*****) 광주광역시 광산구 임곡신촌길 29-2 (신통동) 등 록 원 인 : 통상실시권허여 통상실시권의 범위 기 간 : 2021년 04월 01일부터 2023년 03월 31일까지 지 역 : 전라남도, 전라북도 실시내용 : 특허법 제2조제3호에 규정한 일체의 실시행위	2021년 05월 06일 등록
4번	(통상실시권의 설정등록) 접수 연월일 : 2021년 09월 30일 접수 번호 : 2021-0765343 등록 의무자 : (주)제이제이산업(205911-*****) 전라남도 장성군 장성읍 단풍로 256, 101호 통상실시권자 : 유진피애텍(주)(164711-*****) 충청남도 아산시 배방읍 광장로 177-10, 1409호(펜타폴리스) 등 록 원 인 : 통상실시권허여 통상실시권의 범위 기 간 : 2021년 09월 01일부터 2023년 08월 31일까지 지 역 : 대한민국 전역 실시내용 : 특허법 제2조제3호에 규정한 일체의 실시행위	2021년 09월 30일 등록
4번 부기1	(통상실시권자의 표시통합관리) 접수 연월일 : 2022년 09월 01일 접수 번호 : 2022-5207047 변경 권리자 : 유진피애텍 주식회사(164711-*****) 충청남도 아산시 배방읍 광장로 177-10, 1409호(펜타폴리스) 변 경 사 항 변경전 : 세종특별자치시 한누리대로 284, 마들렌오피스텔 1동 608호 (나성동) 변경후 : 충청남도 아산시 배방읍 광장로 177-10, 1409호(펜타폴리스)	2022년 09월 01일 등록
5번	(통상실시권의 설정등록) 접수 연월일 : 2023년 02월 13일 접수 번호 : 2023-0137175 등록 의무자 : (주)성보종합건설(164711-*****) 충청남도 계룡시 서금암3길 5 ,519호(금암동)	

원본네그리



통상실시권자 : 케이알건설(주)(201111-*****)
전라남도 목포시 평화로 38, 3층 (상동)
등록원인 : 통상실시권허여
통상실시권의 범위
기간 : 2023년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
지역 : 대한민국 전역
실시내용 : 특허법 제 2조 제 3호에 규정한 일체의 실시행위

2023년 02월 13일 등록

이 등본(초본)은 등록원부와 틀림이 없음을 증명합니다.
(제 000066177 호)

2026년 01월 28일


지식재산처



1

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)의 '특허로-증명서발급' 메뉴를 통해 발급번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 단, 발급번호를 통한 확인은 90일까지 가능합니다.

외본대조필



특허 기술 사용 협약서

1.특허명칭	내황산염 모르타르를 활용한 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법
2.특허등록번호	신기술 제974호
3.특허구분	표,단면보수 시공방법
4.특허내용	-내황산염 모르타르로 철근콘크리트 구조물을 단면복구하고, 친환경도막재로 도장하여 열화인자의 침입을 차단함으로써 구조물 사용성을 유지시키는 철근콘크리트 구조물 표면보호 및 보수 기술
5.협약내용	-상기 1항의 특허기술을 10항 기술사용자에게 특허 기술에 대한 실시 간 사용을 계약하고,본 특허공법을 적용 시공하는 공사에 부실시공 방 지노력(시방서,관계법령 준수) 및 성실 시공으로 실시권자의 권익을 보 호한다. -본 협약은 “국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소”에 서 발주한 “제6항 공사내용”에 명시한 공사에 대하여 적용하는 것으로 한정한다.
6.공사내용	국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공사
7.사용기간	상기 공사 계약일에서 ~ 상기 공사 준공시까지
8.협약체결일	2026.04.01
9.기술제공자 (첨부서류참조)	주 소 : 전라남도 장성군 남면 황토단감로88-10,4동 상 호 : 창천기술주식회사 대 표 : 김 효 진
10.기술사용자 (기술사용협약)	주 소 : 경기도 남양주시 다산중앙로 146번길 70-123 2층 상 호 : (주) 아 산 대 표 : 진 익 주 (인)

원본대조필

제974호



신기술지정증서

○ 명 칭 : 내황산염 모르타르를 활용한 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법(슈퍼에스알공법)

○ 개 발 자 : (주)지에프시알엔디, (주)부원지에프씨, 김성수

○ 보호기간 : 2023.12.05. ~ 2031.12.04.(8년)

○ 기술내용 :

이 신기술은 하수박스 등 환경에서 황산염 저항성능을 향상시킨 모르타르와 콜로이드 실리카를 사용하여 장기부착성능을 개선하고, 휘발성유기화합물 사용을 억제하여 사용자 안정성을 확보한 콘크리트 도막재를 이용하며, 굳지 않은 모르타르의 장거리 이송을 가능하게 하여 적용성을 향상시킨 뿔칠장비로 단면 복구하는 콘크리트 보수 및 표면보호공법이다.

○ 기술범위 :

혼합 및 압송 일체형 전용 뿔칠장비로 바륨화합물을 적용한 내황산염 모르타르를 타설하고, 콜로이드 실리카를 사용한 콘크리트 보호용 도막재로 마감하는 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법

○ 보호내용 :

- 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음
- 발주청에 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험, 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있음
- 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설 공사에 신기술을 우선 적용하게 할 수 있음

「건설기술 진흥법」 제14조 및 같은 법 시행령 제33조제1항에 따라 위 기술을 신기술로 지정합니다.

2023년 12월 05일

국토교통부장관



원본대조필





신기술사용협약 증명서

등록번호 제24-47-544호

지정번호	건설신기술 제974호	보호기간 2023. 12. 5. ~ 2031. 12. 4.
신기술 명칭	내황산염 모르타르를 활용한 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법(슈퍼에스알공법)	
기술 개발자	㈜지에프시알앤디, ㈜부원지에프씨, 김성수	
기술 범위	혼합 및 압송 일체형 전용 뿔철장비로 바륨화합물을 적용한 내황산염 모르타르를 타설하고, 콜로이드 실리카를 사용한 콘크리트 보호용 도막재로 마감하는 하수처리 콘크리트 구조물 보수공법	
신기술 사용협약자	상호 또는 법인명	사업자등록번호 696-88-02224
	창천기술주	(법인등록번호) 200111-0660443
	성명(대표자)	협약기간
	김효진	2024. 12. 18. ~ 2026. 3. 31.
	주소 및 연락처	
	광주광역시 광산구 왕버들로 217, 307호	
	(전화 062-974-0210, 팩스 062-974-0209)	

「건설기술 진흥법」 제14조의2에 따라 신기술사용협약이 체결되었음을 증명합니다.

2025년 8월 7일

한국건설교통신기술협회



원본대조필



[붙임1]

■산업안전보건법 시행규칙 [별지 제104호서식] <개정 2023. 9. 27>



기술지도계약서

2026-술 안전 A-030892

건설공사 발주자 또는 건설공사 시공 주도총괄 관리자	성명 또는 사업자명 국토교통부		대표자 조한석	
	법인등록번호 (사업자등록번호) 1111111111111 (1278300201)		사업장관리번호 92110236147	
	주소 경기도 의정부시 송산로 1153 (용현동)		연락처 031-201-3188	
	유형 (공공) [] 정부 [] 지자체 [x] 공공기관 [] 지방공기업 [] 기타 국가기관 (민간) [] 기업 [] 개인			

기술지도 위탁 사업	현 장	공사명 국도46호선 호평IC교(상) 등 포장 및 시설물 보수공	사업개시번호 92603335037	
		공사기간 20260401 ~ 20260729	공사금액 571,022,700 원	
		현장책임자	연락처 031-564-9408	
		소재지 경기 남양주시 호평ic교(상)		
	본 사	건설업체명 (주)아산	대표자 진익주	
		법인등록번호 (사업자등록번호) 1147110001947 (1328113913)	건설면허번호 10-5243	
		주소 경기도 남양주시 다산중앙로146번길 70-123	연락처 031-564-9408	

건설 재해예방 전문지도 기관	명칭 술안전컨설팅지도사사무소	대표자 이상우	
	소재지 경기 여주시 응골로 192-2 (가업동) 208호	지정서 발급번호	제2025-050539호
	담당자 이상우	전화번호	010-4193-4971

기술지도	기술지도 구분	[x]건설공사 []전기,정보통신, 소방시설 공사		
	기술지도 대가 (VAT. 포함)	2,130,400 원	기술지도 횟수	총(8)회
	계약기간	2026년 03월31일부터 2026년 07월29일 까지		

「산업안전보건법」 제73조제1항, 같은 법 시행령 제59조제2항·제60조, 별표18 및 같은 법 시행규칙 제89조의2제1항에 따라 기술지도계약을 체결하고 성실하게 계약사항을 준수하기로 한다.

2026년 03월 31일

건설공사발주자 또는 건설공사시공주도총괄·관리자

국토교통부

사업주 또는 대표자

조한석 (서명 또는 인)

건설재해예방전문지도기관 명칭

술안전컨설팅지도사사무소

건설재해예방전문지도기관 대표자

이상우 (서명 또는 인)

<https://k2b.kosha.or.kr> 의 FAQ에서 위/변조 방지 마크 진위여부를 확인하는 프로그램을 다운 받으실 수 있습니다.

